

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

**Datum(s) van controle:** 10/06/2020  
**Verslagnummer:** 0470-200610-04

**Uitgiftedatum verslag:** 11/06/2020

**Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:**

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 09 252 45 45 E: [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0470

**Identificatie van derden:**

Opdrachtgever: ALGEMENE DAK-& RENOVATIEWERKEN SCHIETTECATTE

Adres: TIJL UILENSPIEGELSTRAAT 23, 9050 GENT

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: SCHEPENS HILDE

Adres: BEUKENLAAN 4, 9240 ZELE

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ALGEMENE DAK-& RENOVATIEWERKEN SCHIETTECATTE

Adres: TIJL UILENSPIEGELSTRAAT 23, 9050 GENT

BTW-nummer: 0841906748

**Identificatie van de elektrische installatie:**

Adres: BEUKENLAAN 4, 9240 ZELE

EAN- code:

Nummer teller: 914131 2012 / 800740 2012

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

**Gegevens van de controle:**

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)

Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)

Datum uitvoering van de installatie:

Vóór 01/10/1981

Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:**

1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N



RE06\_01-08\_01 06/20

Type van de aardelektrode: Aardingsbaren

Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Aantal stroombanen: 19 +3 reserve (reserve inbegrepen)

Type van het aardverbindingssysteem: TT

Aantal borden: 2

Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 25/20A

Type van de algemene schakelaar: 4P 40A/300mA


#### BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

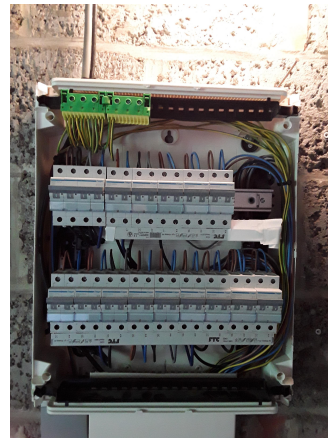

---

#### Resultaten van de controle:

##### Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 15 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 20 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

##### Vastgestelde inbreuken:

Geen

##### Opmerkingen:

Geen

---

#### Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 10/06/2045  
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



## Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

### 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

