

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/10/2025

Inspecteur: Jordi Borlez

Mentor:

Installateur: Elektrowerken Degens BV

ID-label: 002

B.T.W. nr.: BE 0822 477 252

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251295

Datum verslag: 06/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Tommestraat
Huisnummer 7
Busnummer 002
Postcode 3320
Gemeente HOEGAARDEN
Land België

Eigenaar

Naam Boston BV
Straatnaam Tommestraat
Huisnummer 7
Busnummer 002
Postcode 3320
Gemeente HOEGAARDEN
Land België

Installateur

Naam Elektrowerken Degens BV
BTW nr. BE 0822 477 252
Telefoonnummer 0472684110
E-mail info@elektrowerkendegens.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54



Teller Nr.: :-

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 23

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 5,81 MΩ

RE: 2,53 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N13 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N21 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.
- N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/10/2050
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 16:44 tot 17:15

De inspecteur Jordi Borlez

Jordi Borlez
ACEG VZW - #389

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




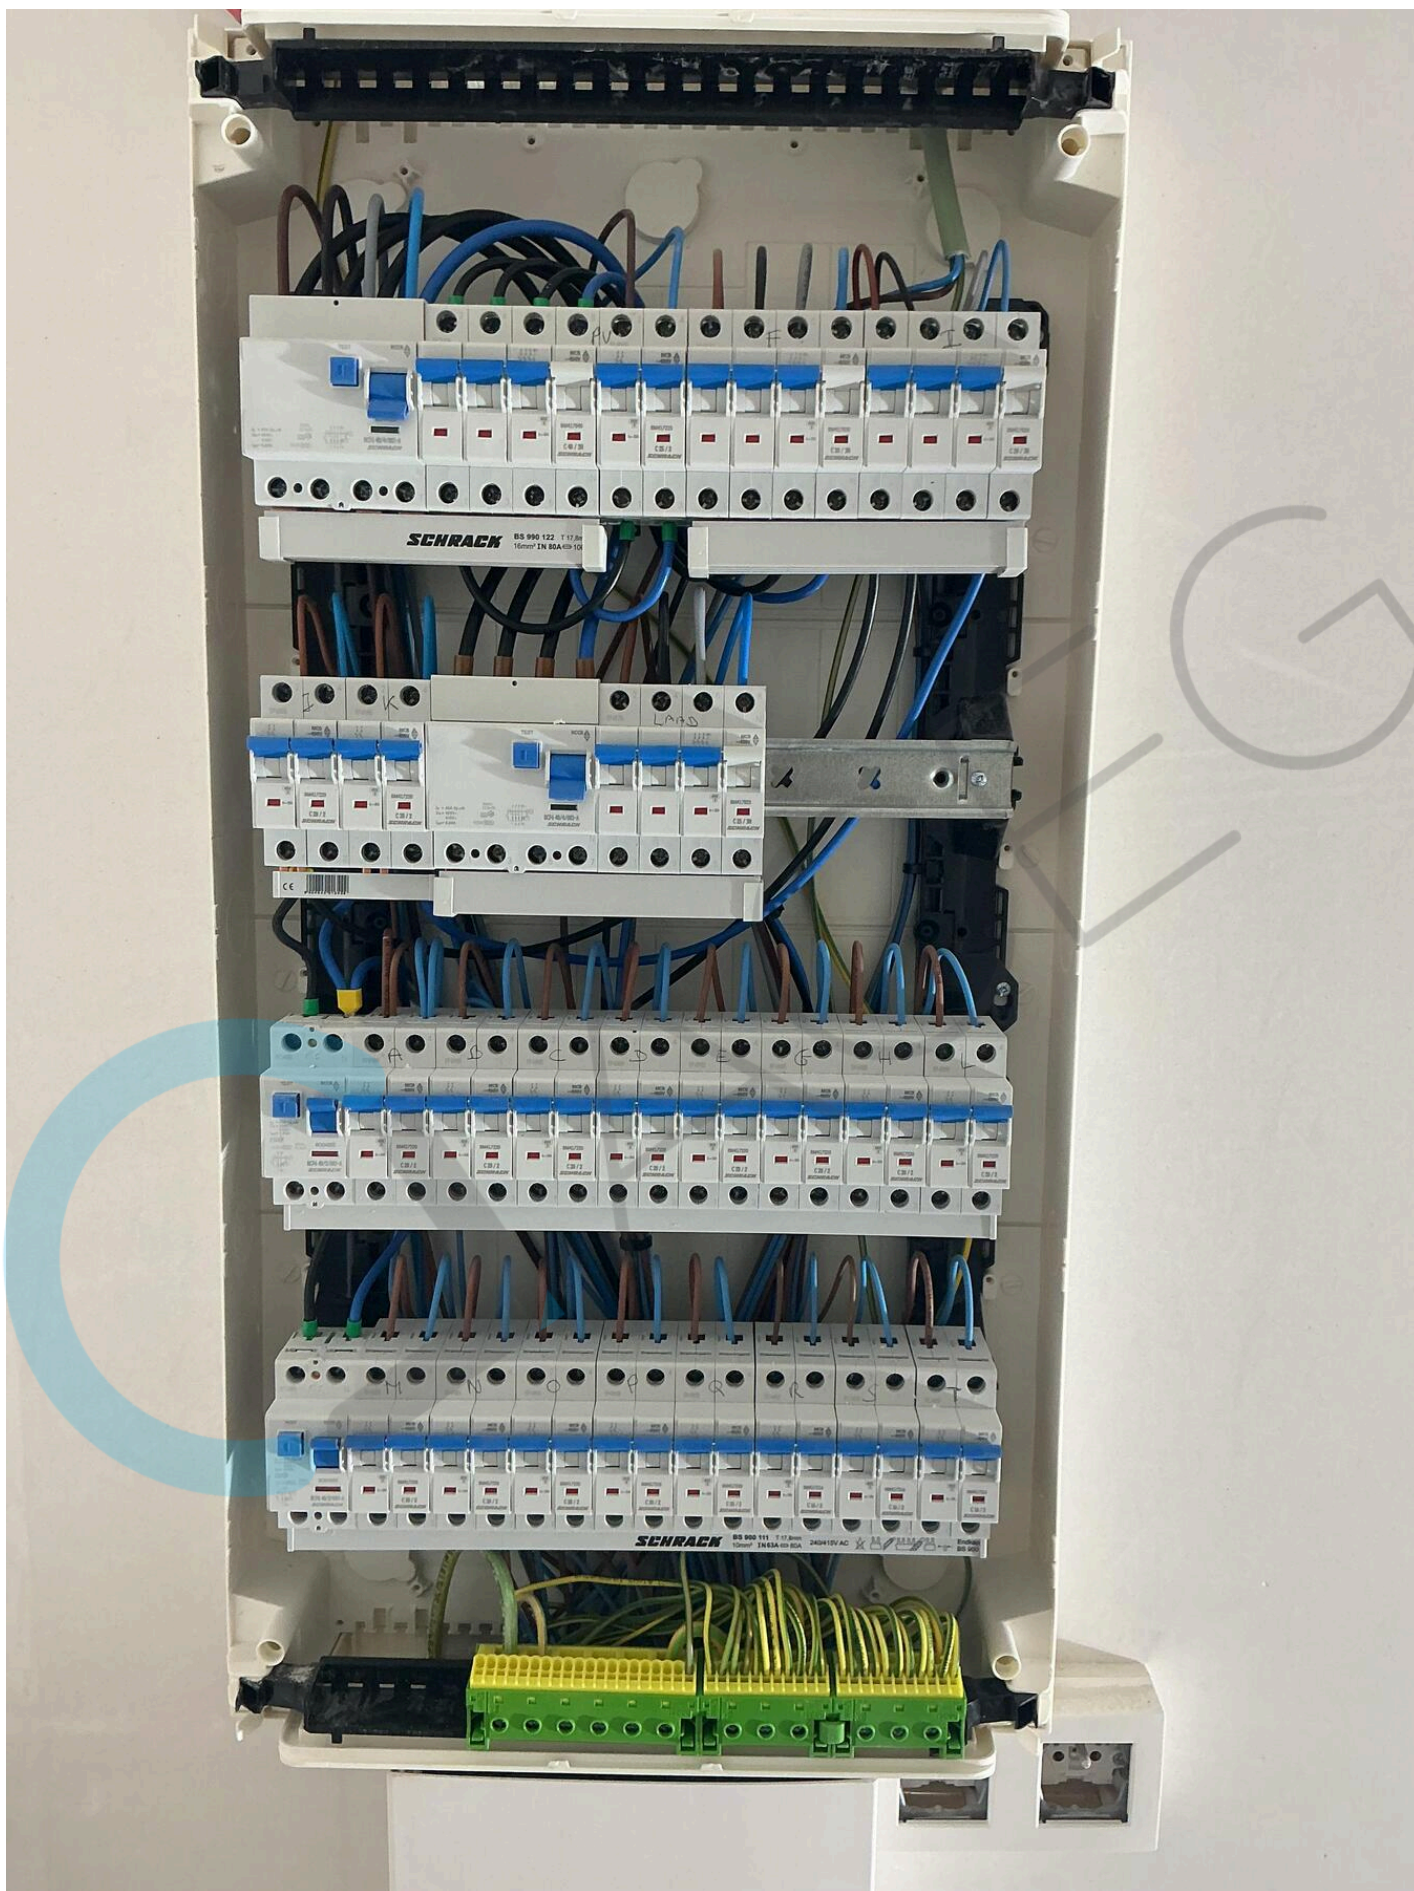



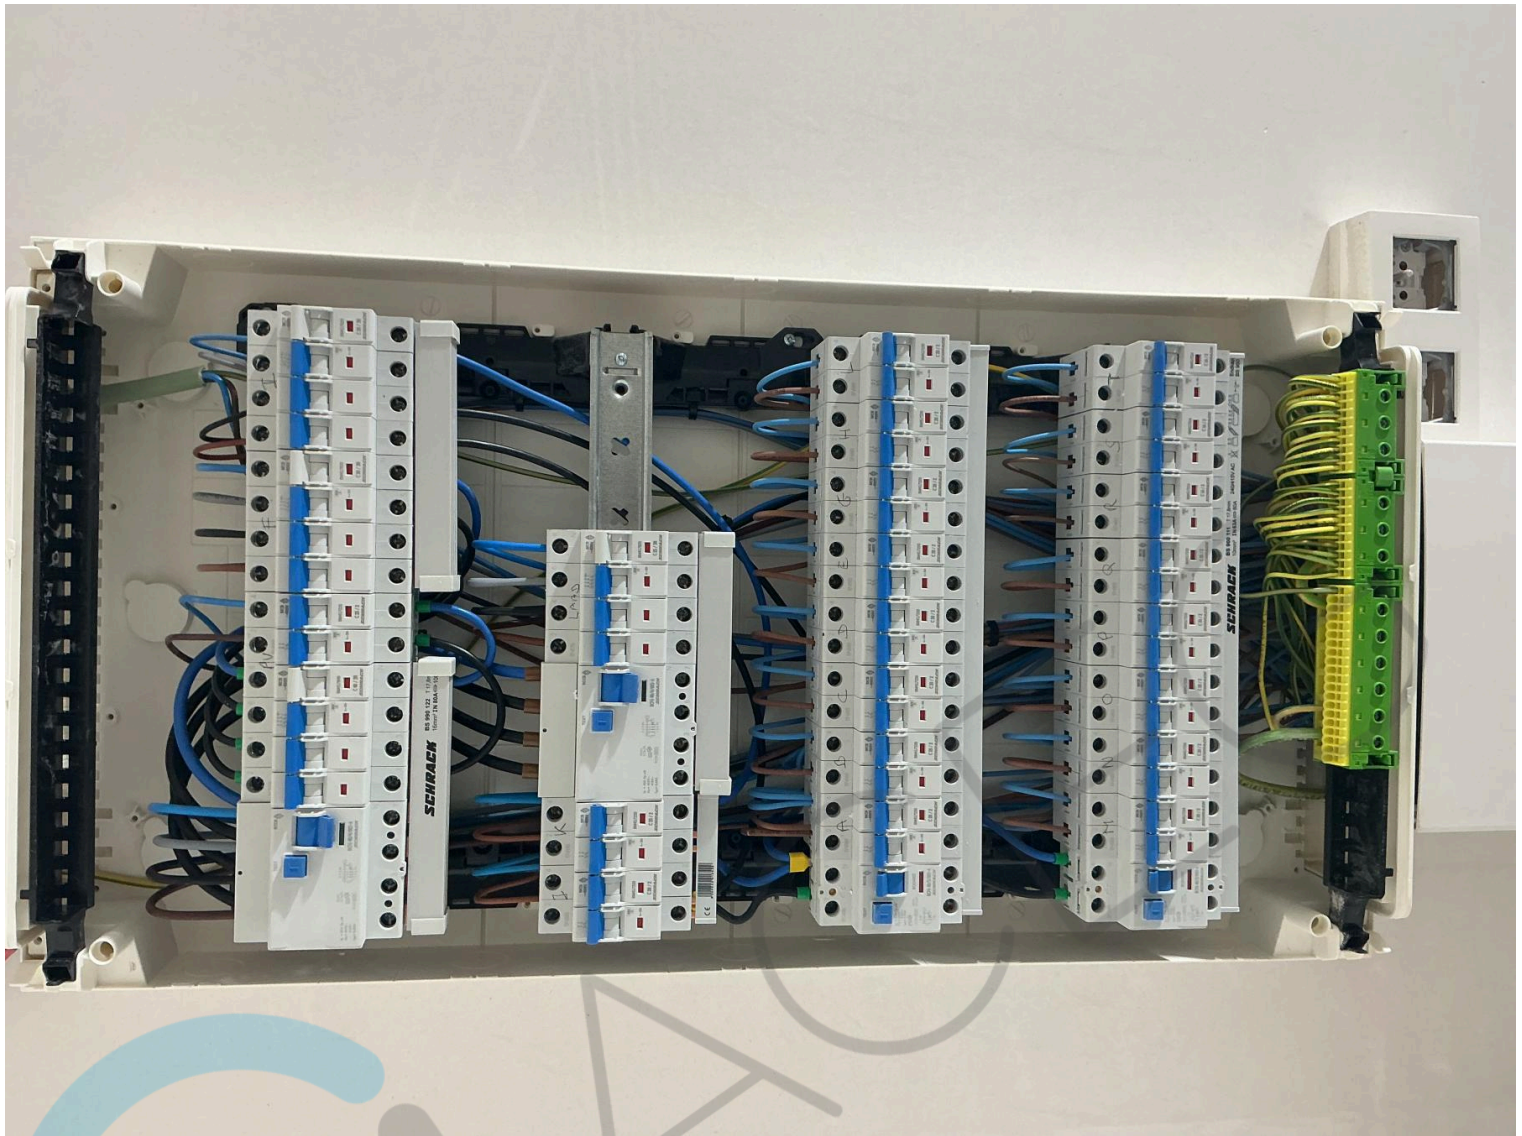





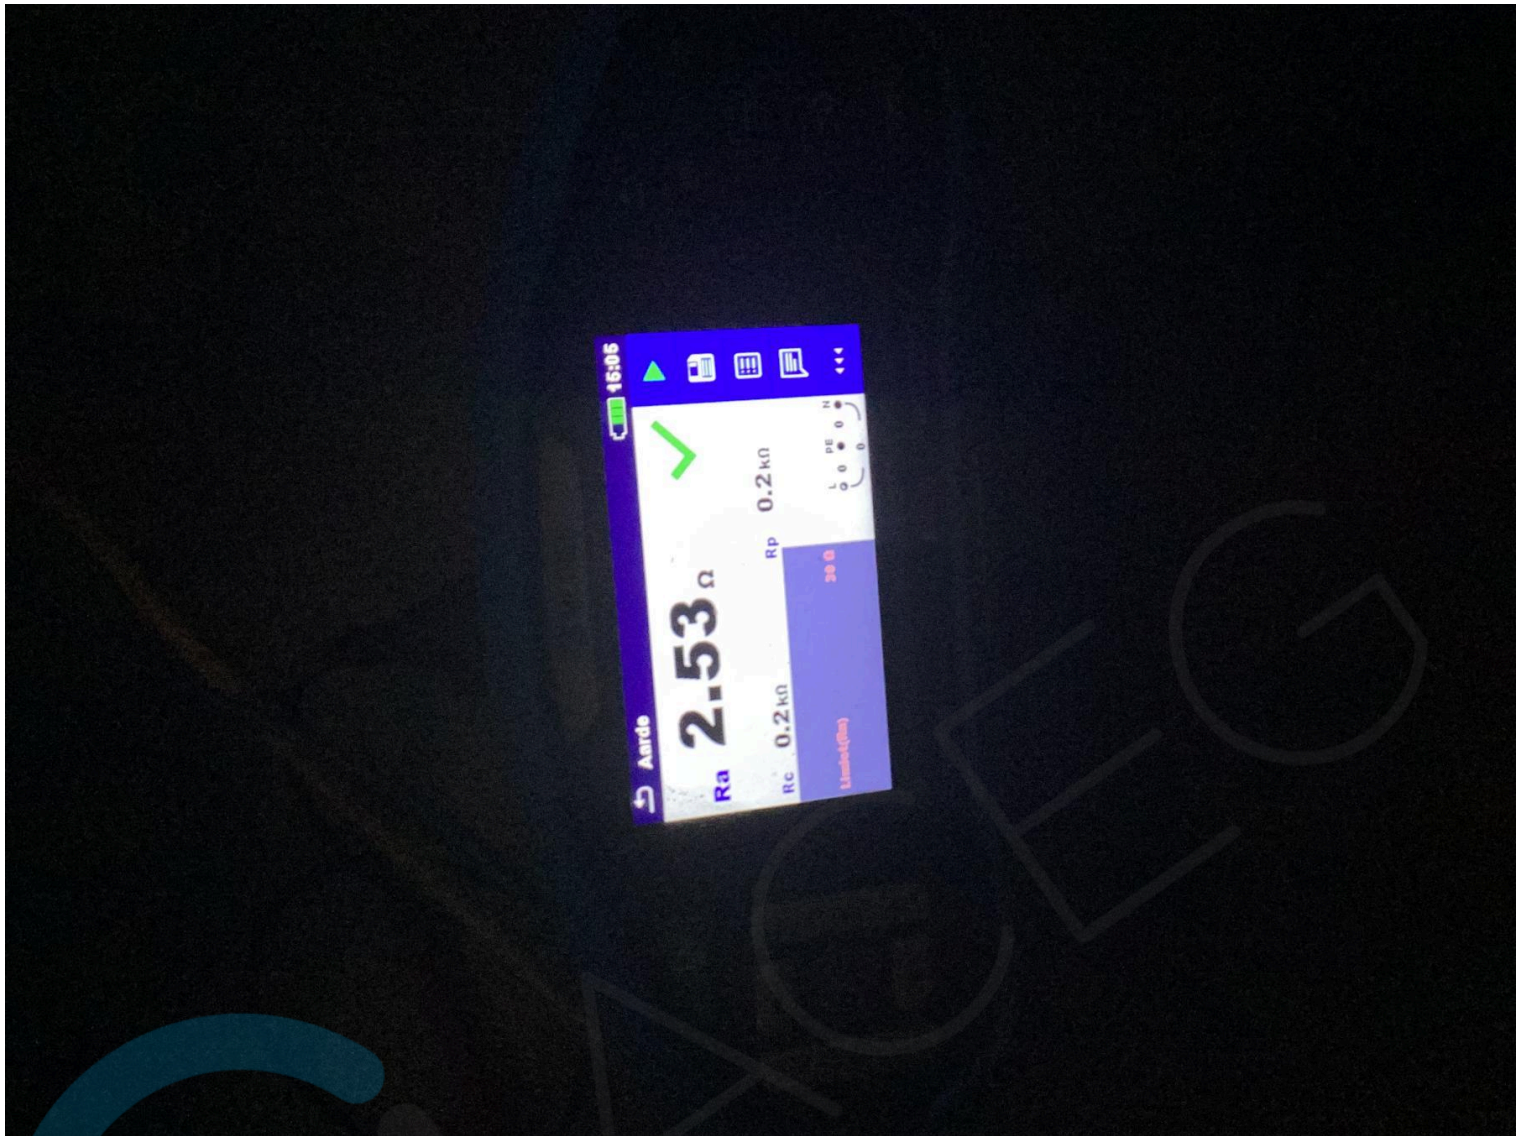






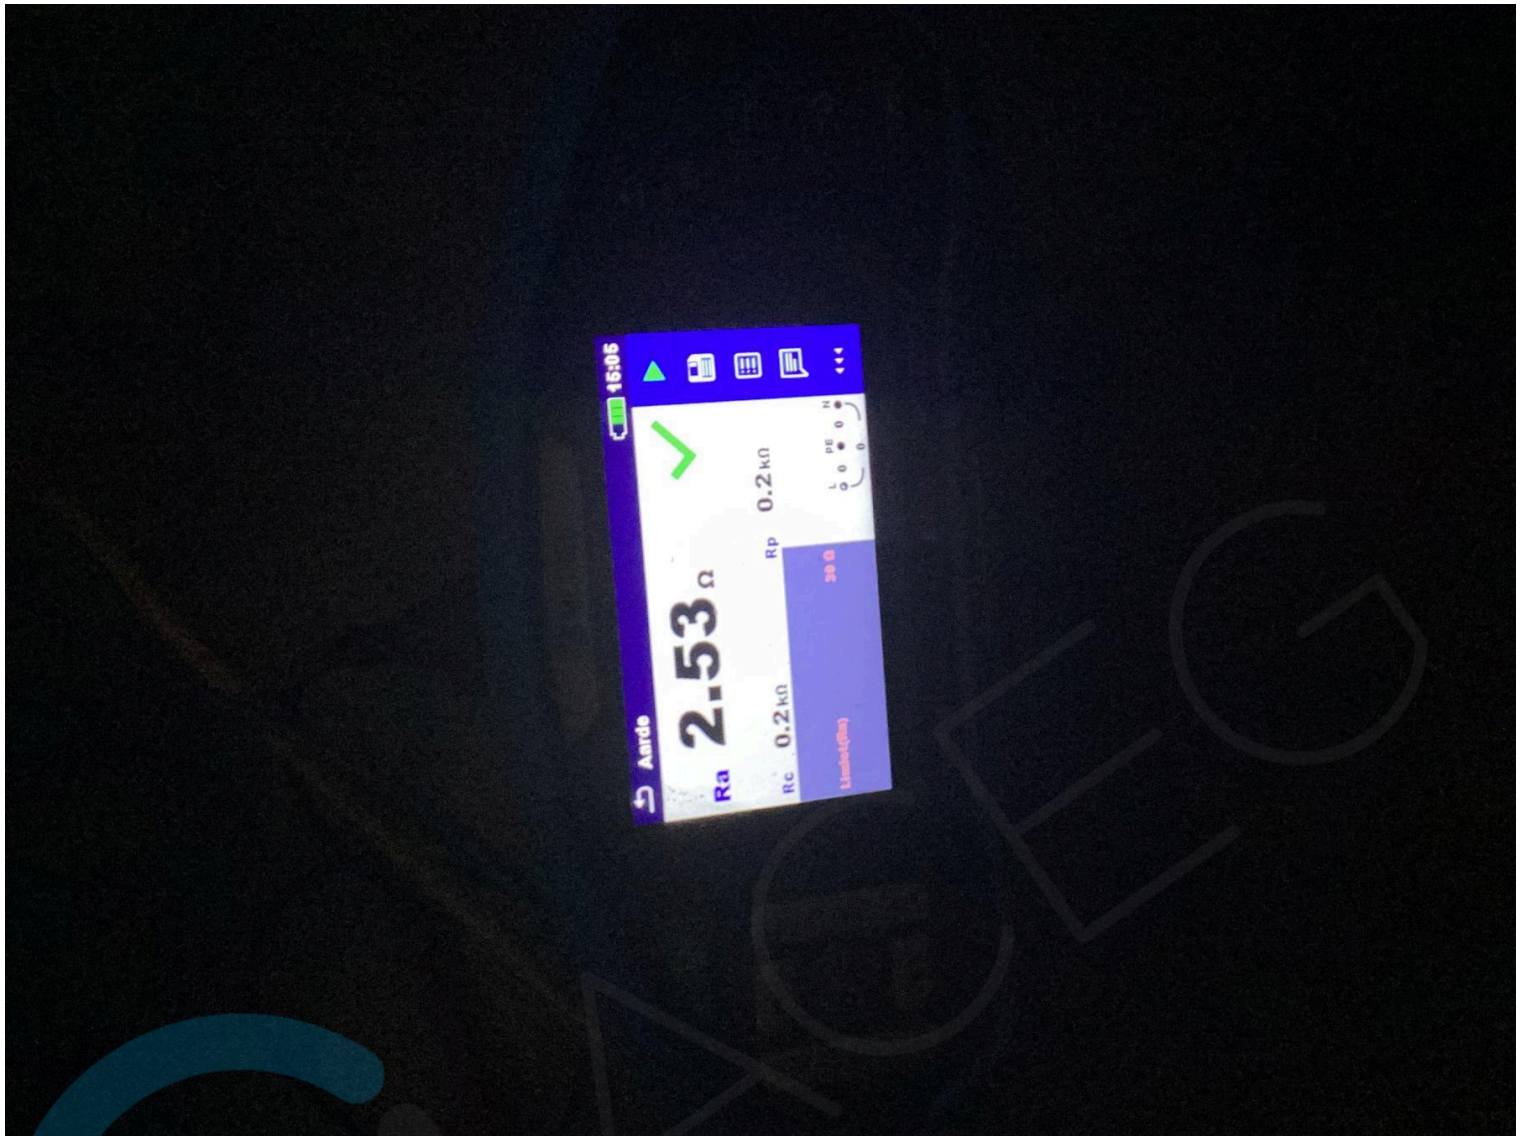



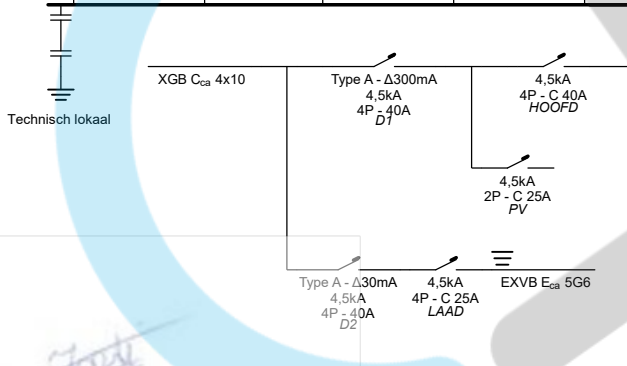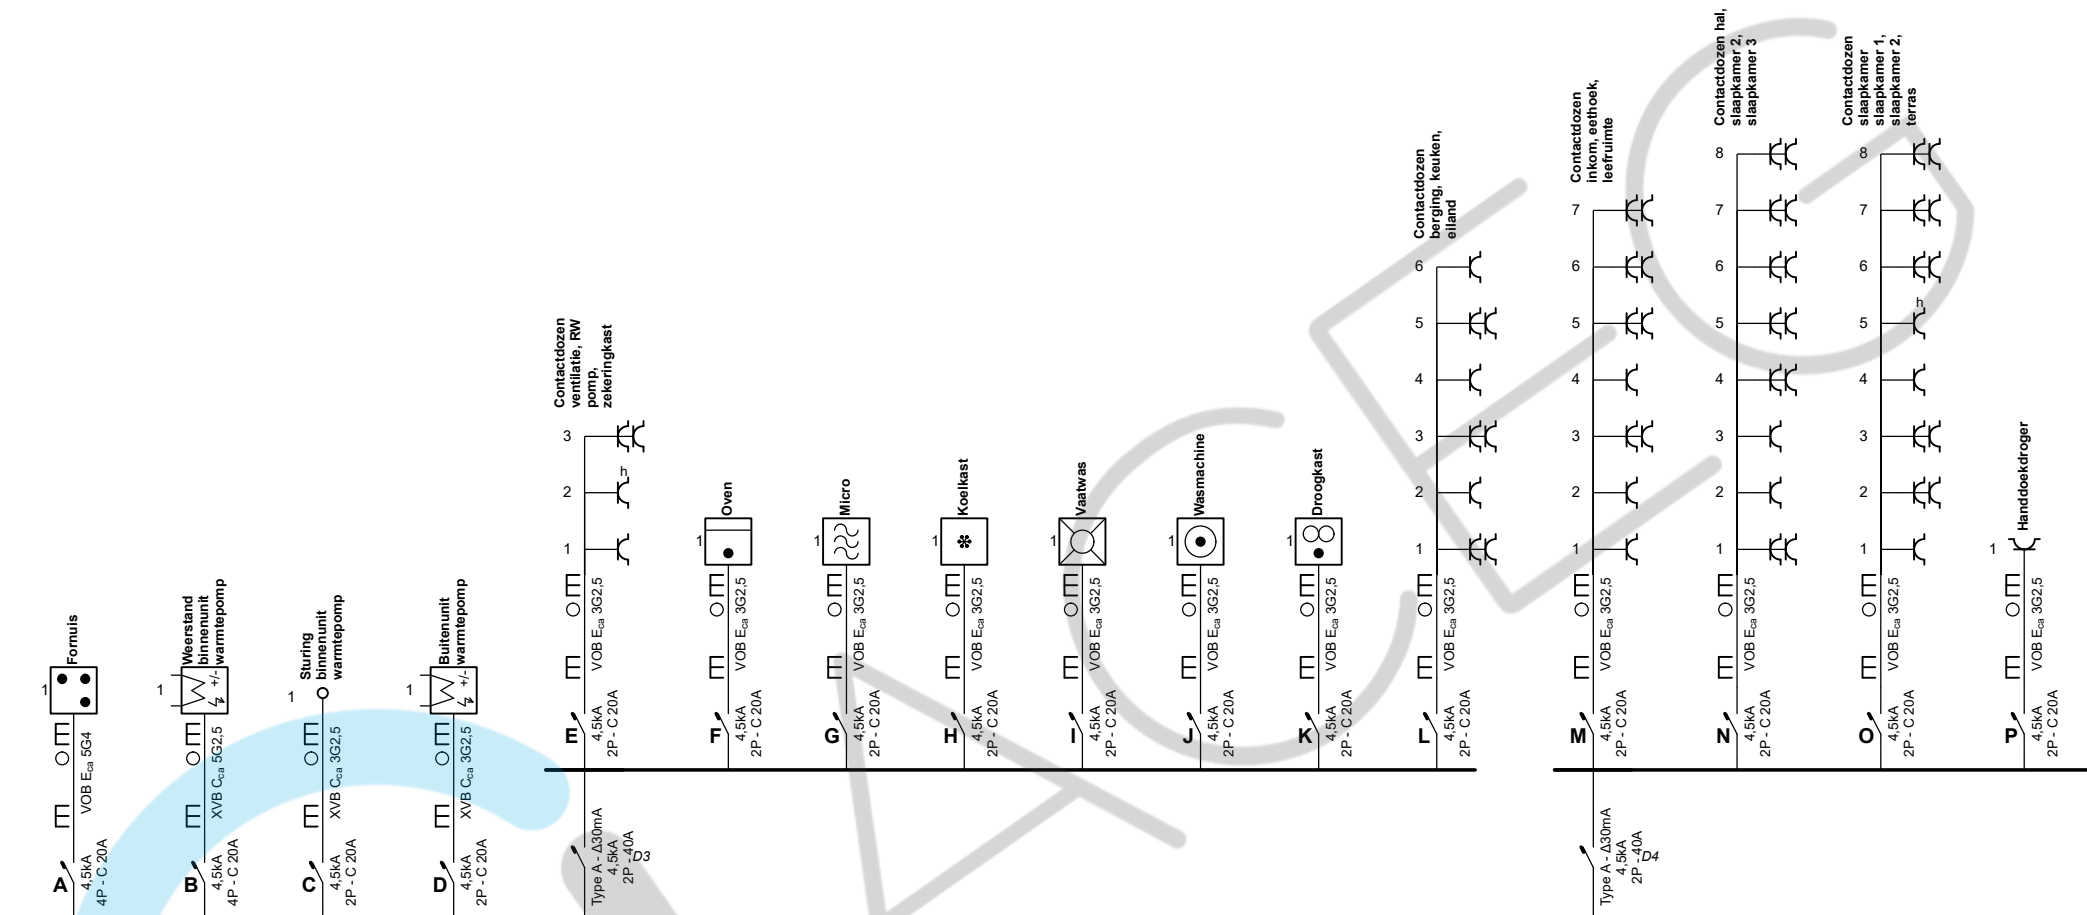

Erkend Organisme
ACEG

Jordi Borlez
ACEG VZW - #389


06/10/2025

Plaats van de elektrische installatie
Boston BV
Tommestraat 7 Bus 002
3320 Hoegaarden

Installateur
Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Broedersblok 3
3300 Hakendover
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822.477.252

DEGENS BV

p. 1/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

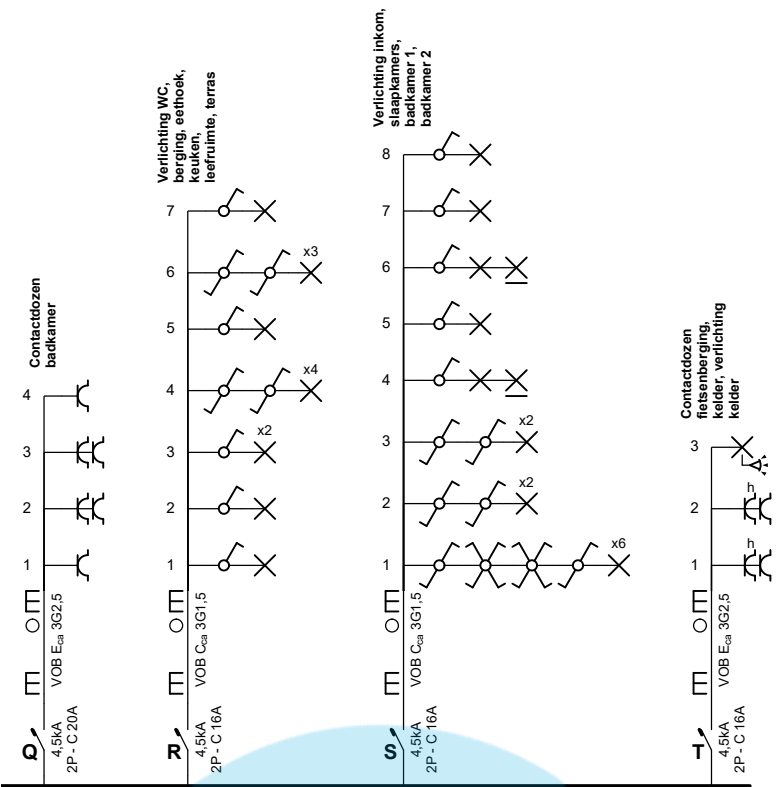

Erkend Organisme
ACEG

Jordi Borlez
ACEG VZW - #389

06/10/2025


Plaats van de elektrische installatie
 Boston BV
 Tommestraat 7 Bus 002
 3320 Hoegaarden

Installateur
 Elektrowerken Degens B.V.B.A.
 Broedersblok 3
 3300 Hakendover
 GSM: 0472 68 41 10
 e-mail: info@elektrowerkendegens.be
 BTW BE 0822.477.252

De



p. 2/4
Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

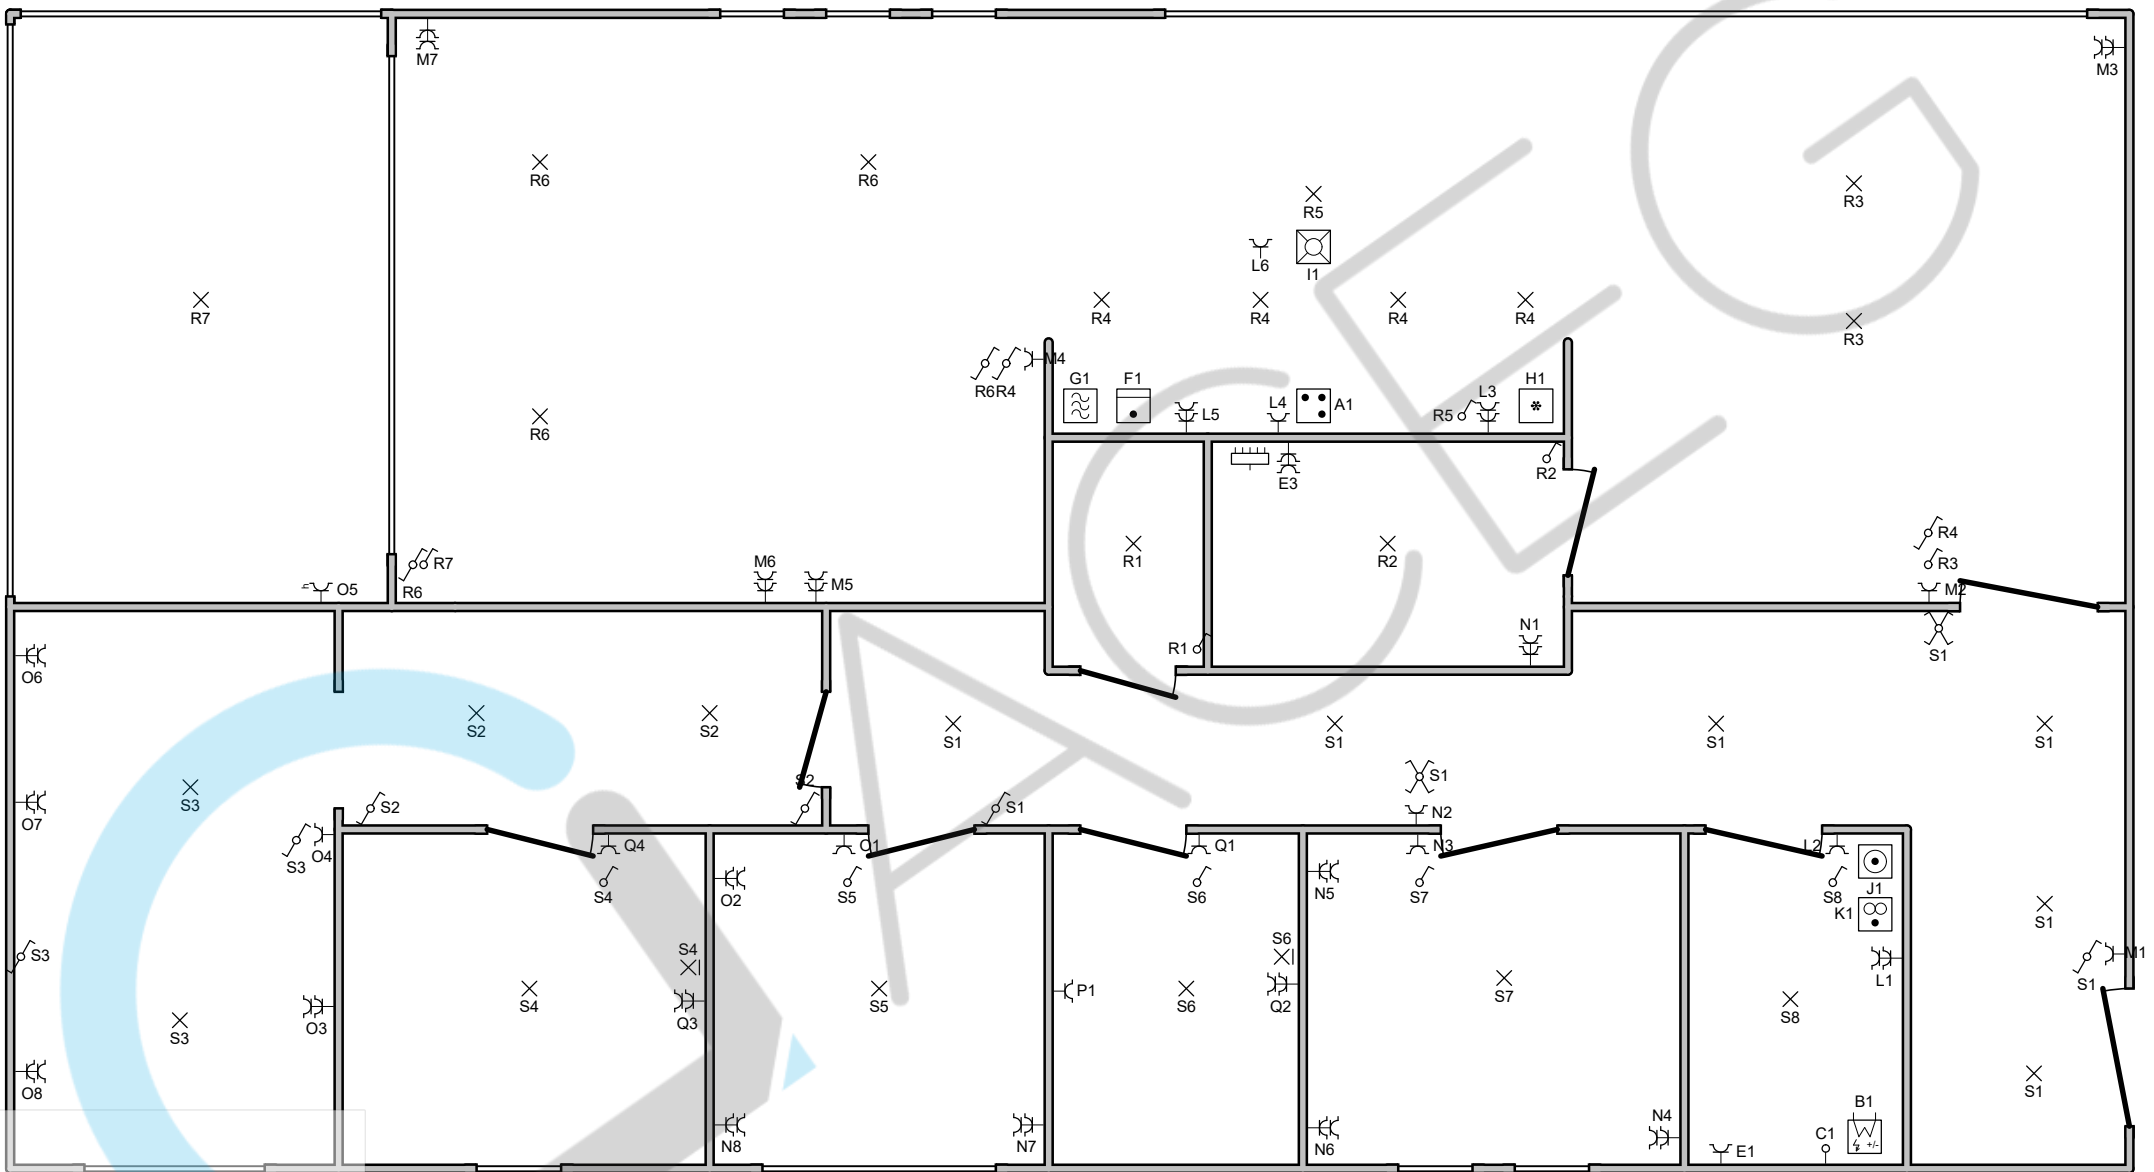

Erkend Organisme
ACEG

Jordi Borlez
ACEG VZW - #389

06/10/2025

Plaats van de elektrische installatie

Boston BV
Tommestraat 7 Bus 002
3320 Hoegaarden

Installateur

Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Broedersblok 3
3300 Hakendover
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822.477.252


ELEKTROWERKEN




DEGENS BV

**p. 3/4
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz

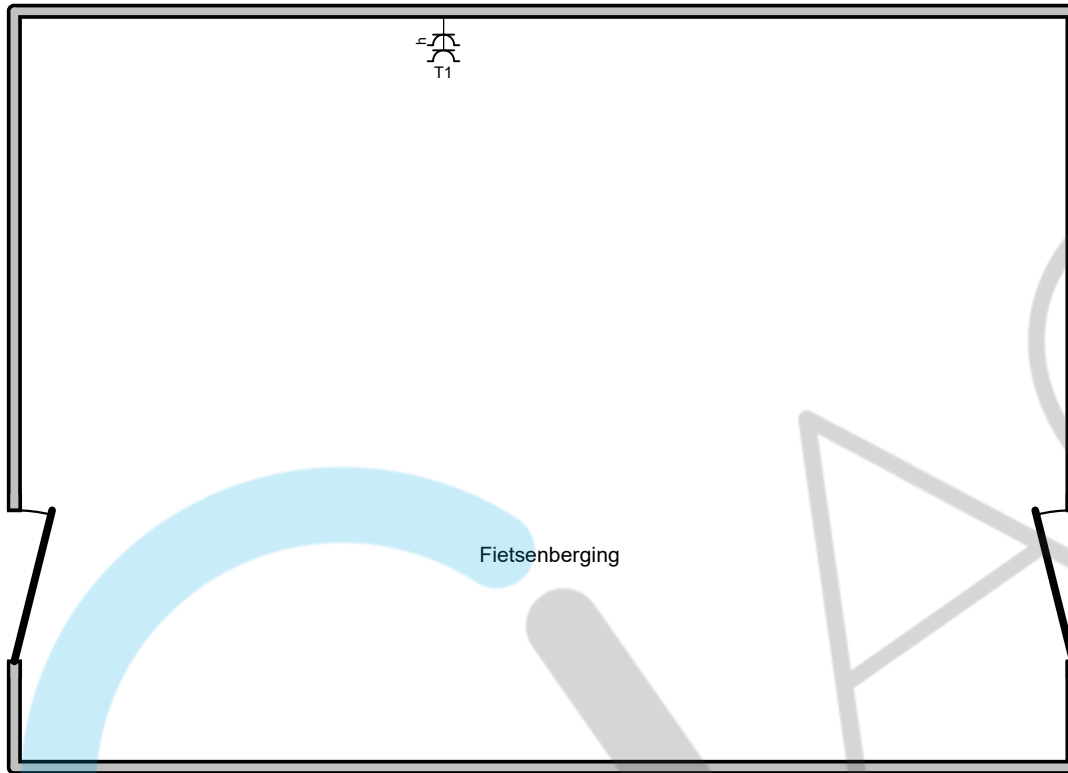

Fietsenberg

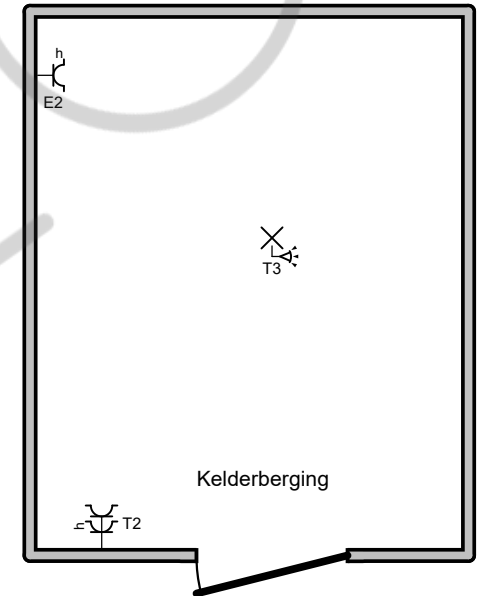

Kelderberging

Erkend Organisme
ACEG

Jordi Borlez
ACEG VZW - #389

06/10/2025

Plaats van de elektrische installatie

Boston BV
Tommestraat 7 Bus 002
3320 Hoegaarden

Installateur

Elektrowerken Degens B.V.B.A.
Broedersblok 3
3300 Hakendover
GSM: 0472 68 41 10
e-mail: info@elektrowerkendegens.be
BTW BE 0822.477.252

De

ELEKTROWERKEN



DEGENS BV

**p. 4/4
Situatieplan**

3 x 400V + N ~ 50Hz
