



Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 72700
Cont.peers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: erk@thyserik.be

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProjKo.: LS01
Verslagnr.: 5155281
Voort. verslagnr.:
Datum: 06/03/2019

Klant / Opdrachtgever:
THYS ERIK
RECHTESTRAAT 33A
2680 PUTTE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: bestaande + uitbreiding Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: LEUVENSESTEENWEG 274 MUIZEN (MECHELEN) 2812 Volgens AREI Art: 86/270/271
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek + controlebezoek
Datum onderzoek: 01/03/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2044 Onderzoeker: OP DE BEECK STIJN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 23,5 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werkings testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 2,09 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrische materiaal: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aantaking: in orde onrechtstreekse aantaking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14 + 11

Zie schema's.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstgoemerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

BESLUIT

De installatie is niet conform aan het AREI. De installatie mag niet in dienst gesteld worden.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd door het zelfde organisme **uiterlijk op hoger vermelde datum of uiterlijk 12 maanden na datum controle**, zoals voorzien door art. 274 van het AREI.

Er moet zonder vertraging voldaan worden aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

2 * 240 v

leuvensesteenweg 274
2812 Muizen


fietsenberging
kast A

installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kortich
Onderzoeker: OP DE BEECK STJUN
Datum: 01/02/2019
PV nr.: 5155281
Handtekening:

16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	32 A
kamer 3 licht 1v	kelder	kamer 1		verlichting traphal & CV		living & verlichting fietsenberging	fietsenberging & living	
A	B	C	D	E	F	G	H	I

16 A	16 A	20 A	20 A	M1				
badkamer 1 & 2v	verlichting 2v	badkamer 1v lavabo	bel	transformator 12v				
J	K	L	M					

0,3 A	0,03 A	32 A						
verliesstroom	verliesstroom	WC						
		Bord B						
Algemeen	Vochtige ruimten	g - r						
	A - M							

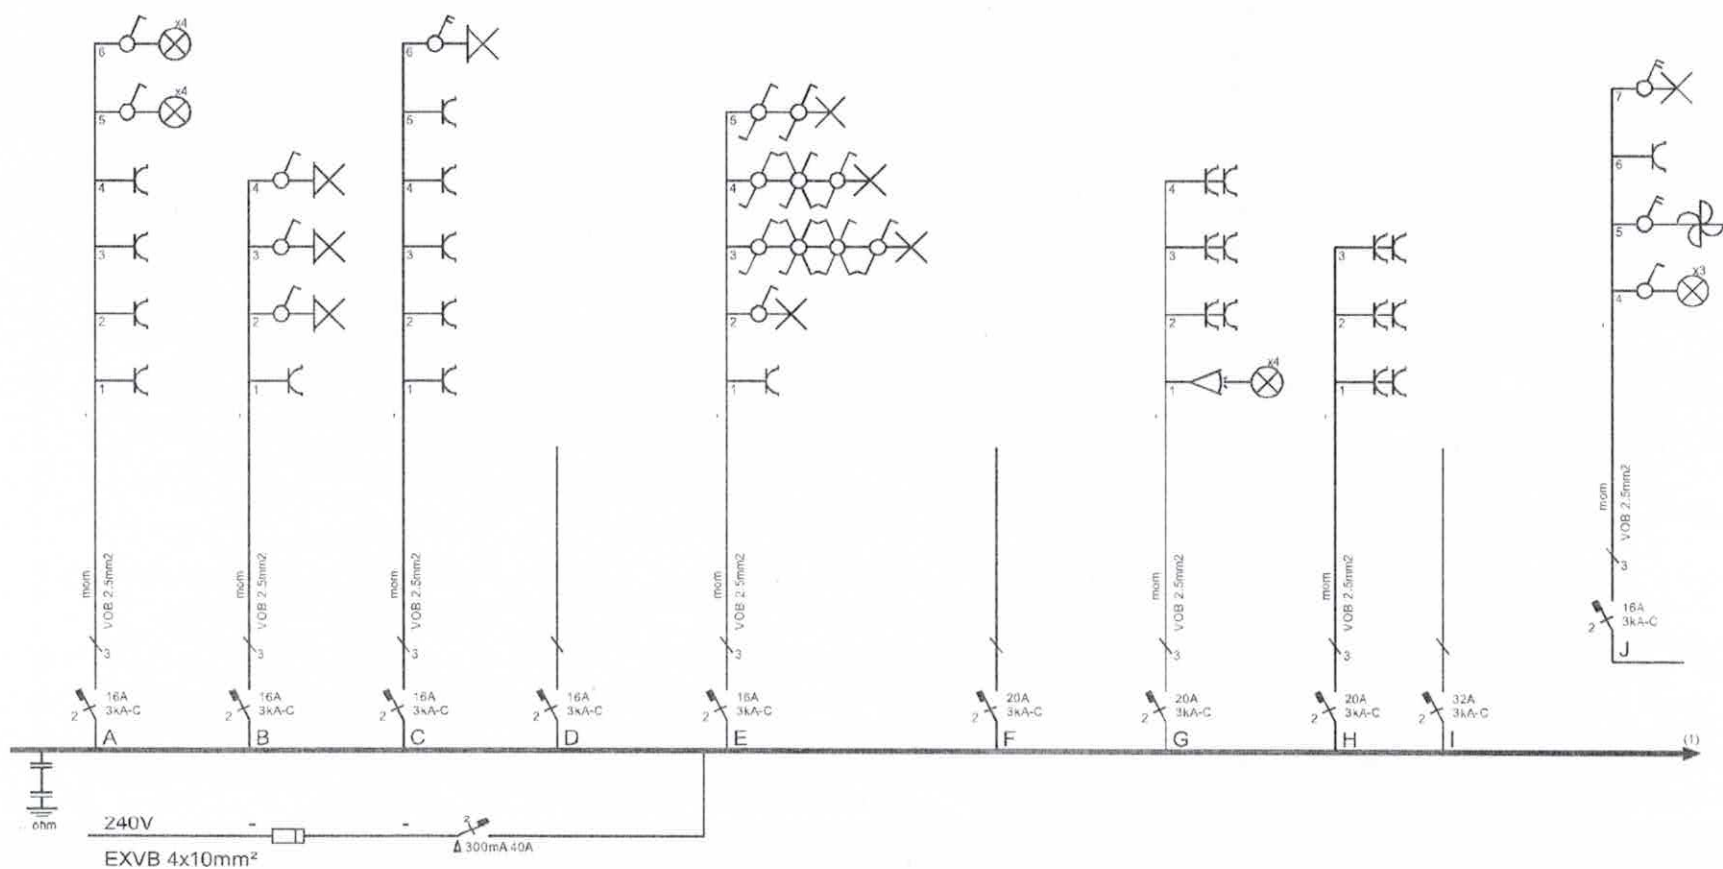

Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2019


leuvensesteenweg 274
2812 Muizen

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2019

Thijs bvba

Rechtestraat 33A
2580 Putte

BTW:BE 454.186.266
Tel: 015/75.23.50

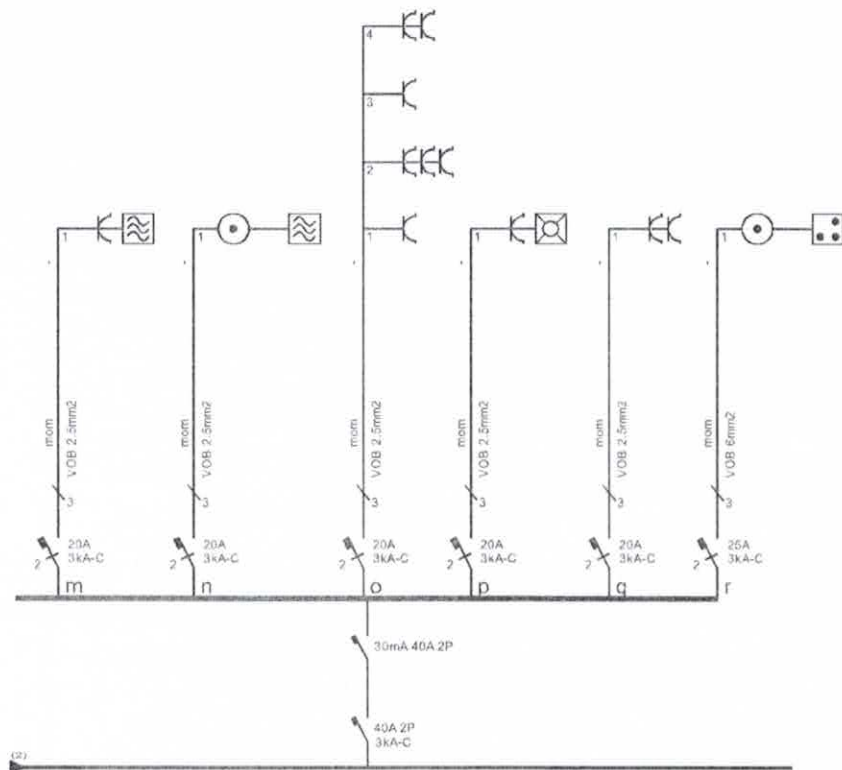

Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2019

leuvensesteenweg 274
2812 Muizen

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2019


Thijs bvba

Rechtestraat 33A
2580 Putte


BTW:BE 454.186.266
Tel: 015/75.23.50



gelijkvloers

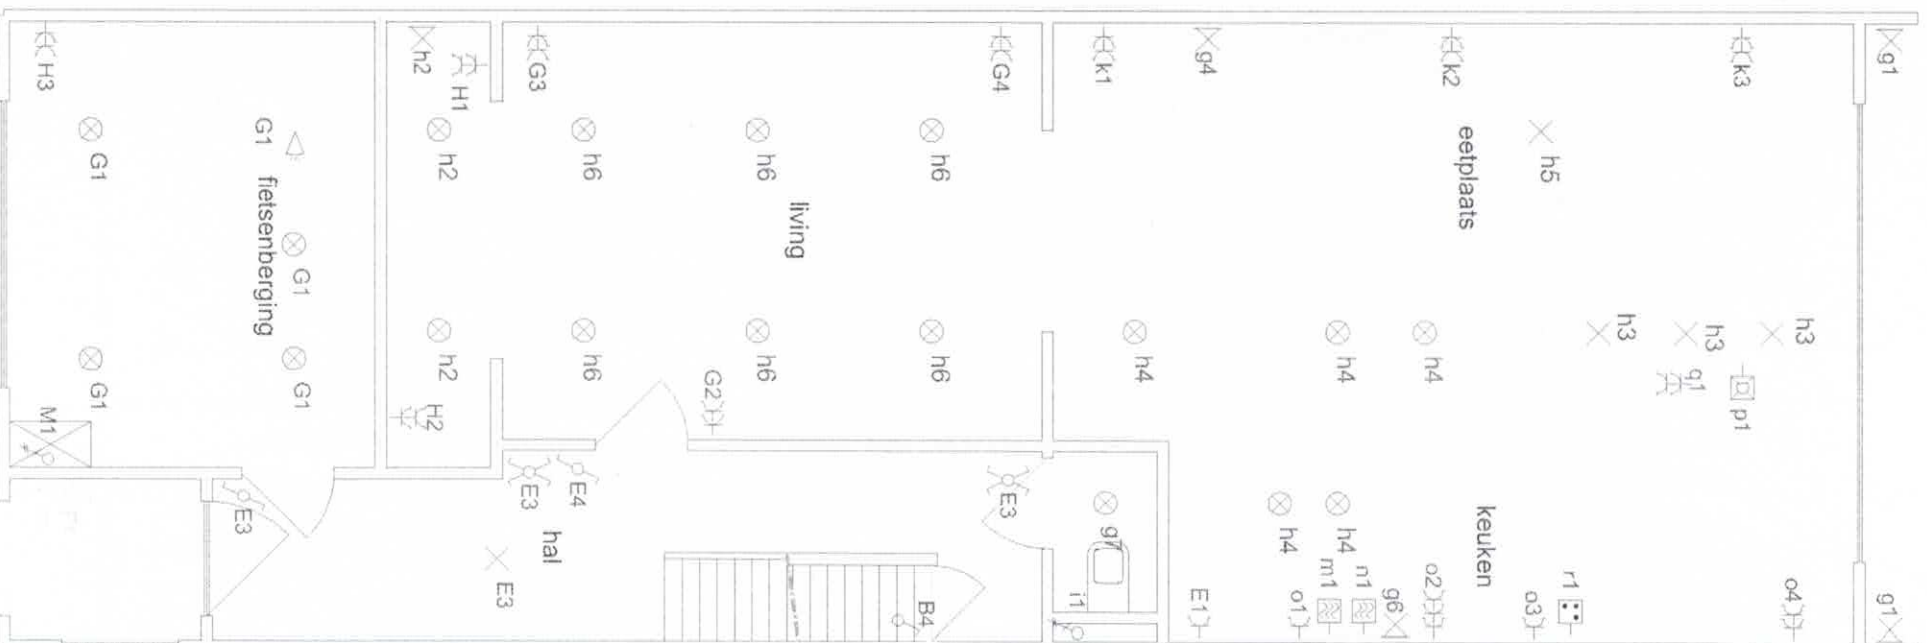

1ste verdiep

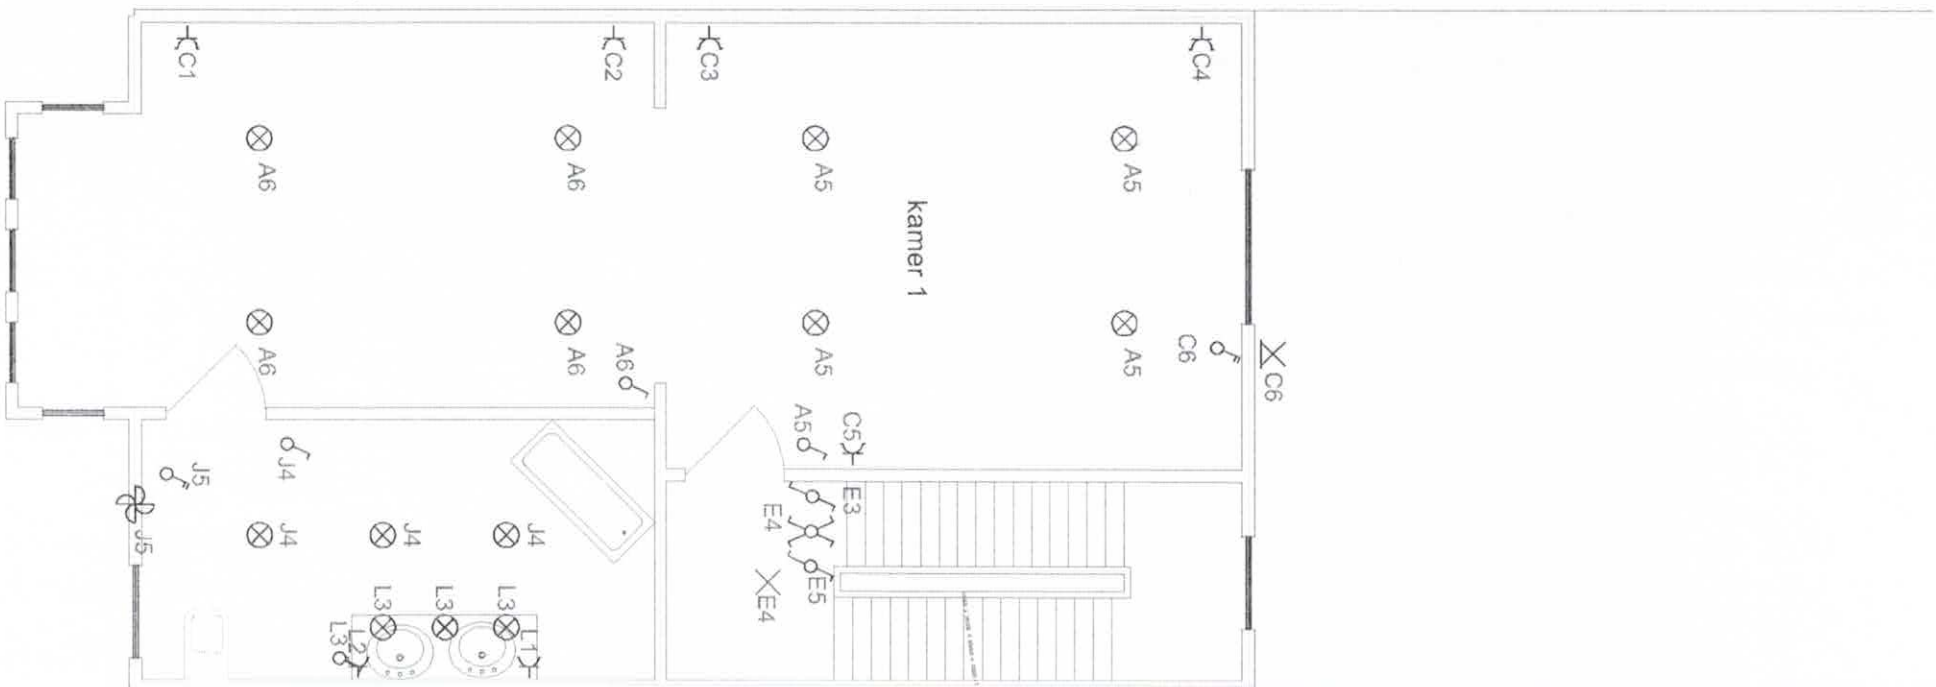

2 de verdiep



kelder

