

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/02/2026

Inspecteur: Maxim Engels

Mentor:

Installateur: Goossens
elektriciteitswerken Bvba

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0674 467 625

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481263

Datum verslag: 25/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Klaverbeekstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9250
Gemeente WAASMUNSTER
Land België

Eigenaar

Naam Van Montfort
Straatnaam Klaverbeekstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9250
Gemeente WAASMUNSTER
Land België

Installateur

Naam Goossens elektriciteitswerken Bvba
BTW nr. BE 0674 467 625
Telefoonnummer +32 471 60 78 73
E-mail info@goossenselektriciteitswerken.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541 448 820 065 491 162

Teller Nr.: : 1SAG3100421293



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 32 A

Aantal kringen: 22

Ri algemeen: 135,5 MΩ

RE: 4,05 Ω

OK

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	22	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/2/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:45 tot 10:21

De inspecteur Maxim Engels

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele notities	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/2/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


CLACEG

Situatieschema: Gelijkvloers

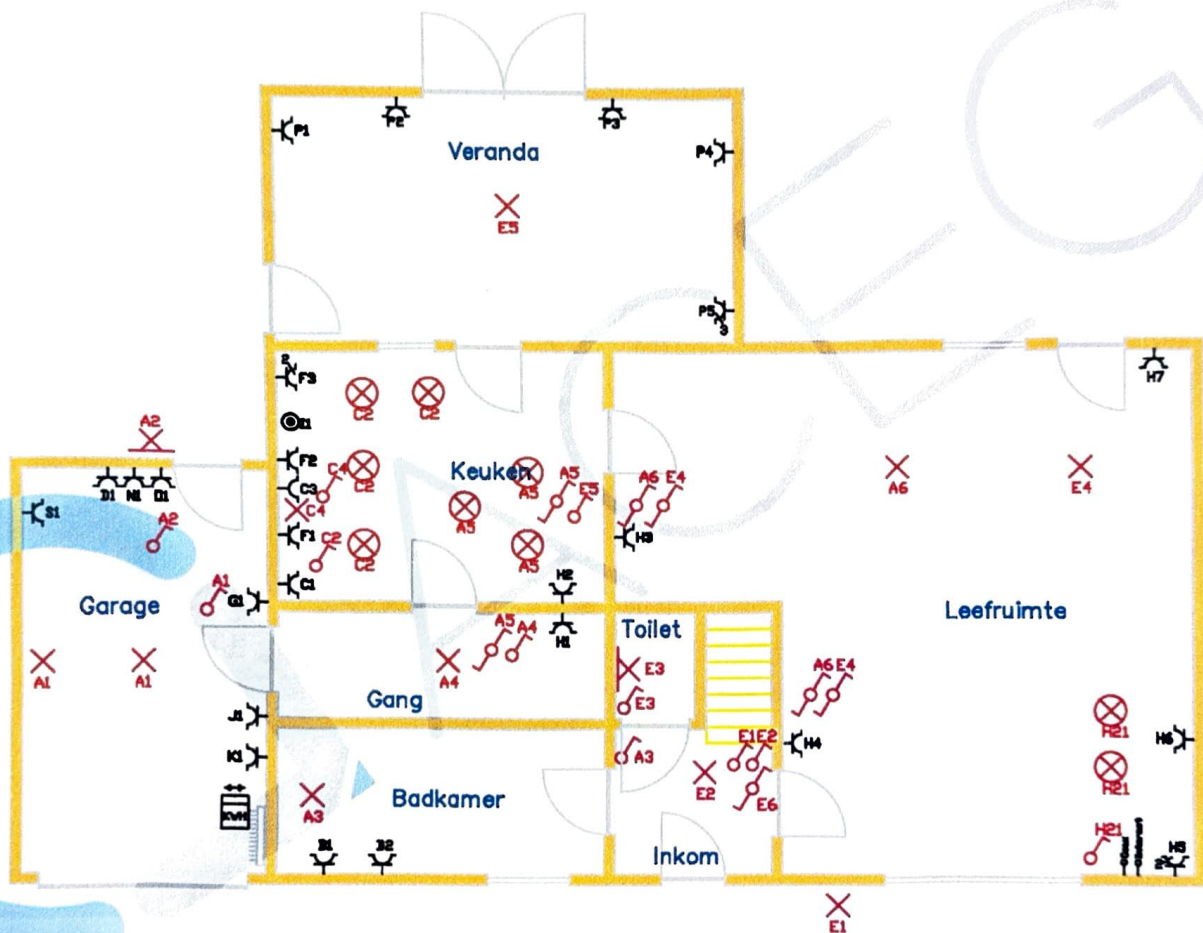


Bouwheer: Van Monfort Marc Street: Klaverbeekstraat 10 Postcode: 9250 Gemeente: Waasmunster	Uitvoerder: Goossens Elektriciteitswerken BTW nr.: BE 0674.467.625 Datum: 4/02/2026 Handtekening: 	Keuringsorganisme: Naam keurder: Datum keuring: Handtekening:	Pagina : 1/4
--	--	--	------------------------

Situatieschema: 1e Verdiep

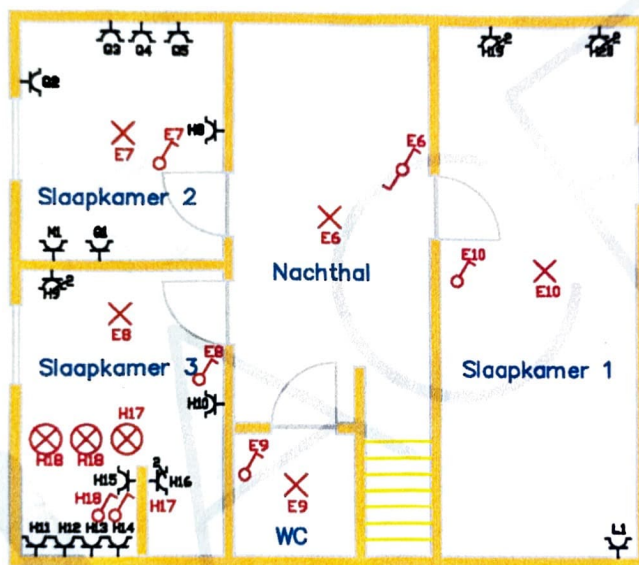


Bouwheer: Van Monfort Marc Street: Klaverbeekstraat 10 Postcode: 9250 Gemeente: Waasmunster	Uitvoerder: Goossens Elektriciteitswerken BTW nr.: BE 0674.467.625 Datum: 4/02/2026 Handtekening: 	Keuringsorganisme: Neem keurder: Datum keuring: Handtekening:	Pagina : 2/4
--	--	--	------------------------

Verdeelbord 1

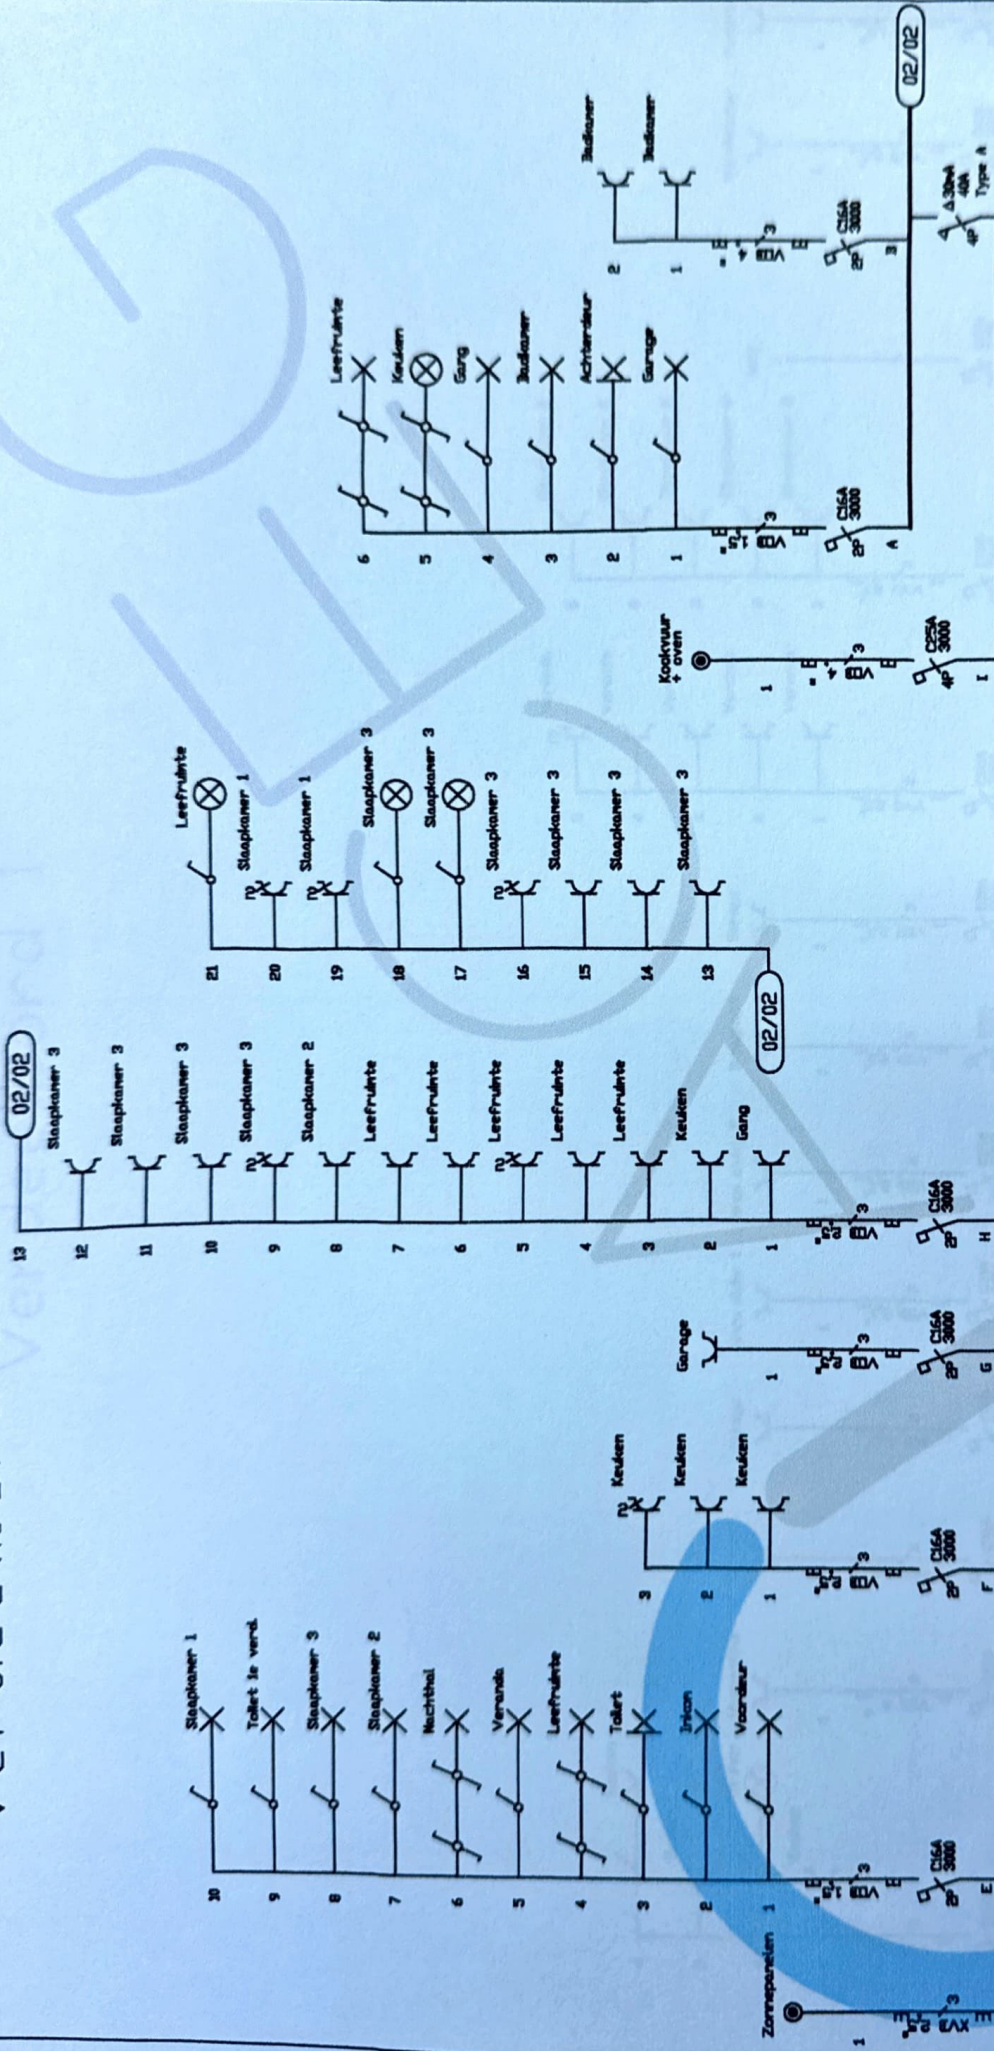

Pagina: 3/4	Keuringsorganisatie: Naam keurder: Datum keuring: Handtekening:
Bouwheer: Van Nonfort Marc Straat: Klaverboeckstraat 10 Postcode: 9250 Gemeente: Voerendaal 25/02/2026	Uitvoerder: Goossens Elektriciteitswerken BTW nr.: BE 0674.467.625 Datum: 4/02/2026 Handtekening: Goossens

Verdeelbord 1

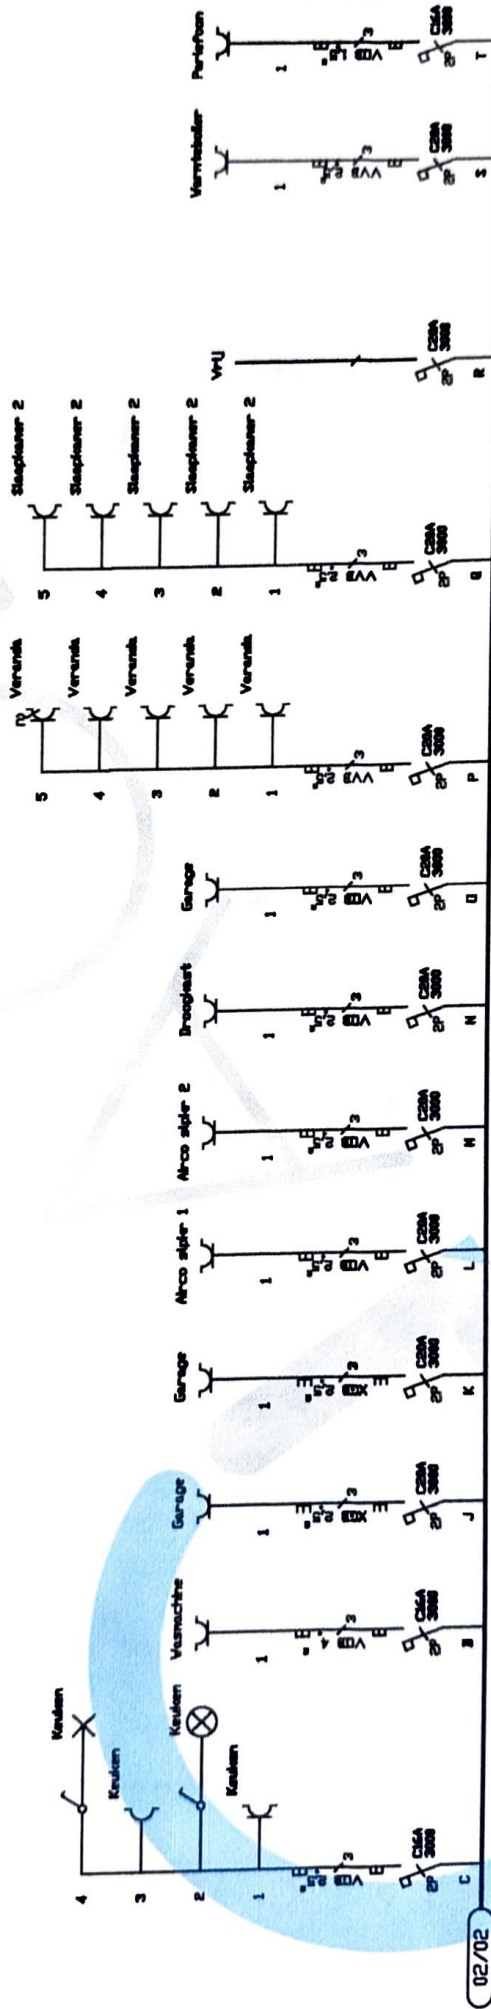

Van Manfort Marc

Street: **Klaverbeekstraat 10**

Postcode: 9250

Gemessen:

Uitvoerder:
Gooss
BTW nr.:

BTW nr.: BE 0674.467.625

Destum: 4/02/2026

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Naam kourder:

Datum keuring:

Handtokening:

Página : 4/4

25/02/2026
