

KEURINGSVERSLAG

Woning

AARD ONDERZOEK

Controlebezoek (van een huishoudelijke elektrische installatie) volgens hoofdstuk 6.5. van het AREI

VERSLAGNUMMER	DATUM CONTROLE	KLANTREFERENTIE
8106	09/10/2026	-

BESLUIT VAN DE KEURING

× AFGEKEURD

De elektrische installatie voldoet niet aan de toepasselijke voorschriften van AREI Boek 1. De vastgestelde inbreuken moeten zonder vertraging worden verholpen. Indien de installatie in dienst blijft, moeten alle gepaste maatregelen worden genomen om gevaar voor personen en goederen te voorkomen. Het verdwijnen van de inbreuken moet worden nagezien door hetzelfde erkende organisme. Indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, informeert dit organisme de bevoegde dienst van de FOD Economie binnen één jaar.

PLAATS VAN ONDERZOEK

Bloemenlaan 55
9690 Kluisbergen
Belgium

OPDRACHTGEVER

Veerle Vanhaesebroeck
info@certimax.be
0496234298

AGENT-BEZOEKER

De Pauw Jelle
Erkenning 001
Mentor: -

CONTROLEPUNTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Schema's	NIET OK	Testen	OK	Kabels / connecties	NIET OK
Verdeelbord	OK	Transformatoren	NVT	Differentieelstroominrichting	OK
Vermogensschakelaar(s)	OK	Aarding / equipotentiaal	OK	Toestellen, contactdozen	NIET OK

Als keurder voor Be R1GHT verklaar ik hierbij dat mijn oordeel en conclusies volledig onpartijdig en objectief zijn, zonder enige vorm van vooringenomenheid, belangenconflict of externe beïnvloeding.



De Pauw Jelle

HANDTEKENING CONTROLEAGENT

01 ALGEMENE INFORMATIE

DATUM CONTROLE	09/10/2026	AGENT-BEZOEKER	De Pauw Jelle
MENTOR	-	MERK & TYPE	Metrel EurotestXD
SERIENUMMER	24080645	TYPE GEBOUW	Woning
EAN NUMMER	541448820067125959	TELLER NUMMER	1SAG1100794727
EAN NIET GECOMMUNICEERD	NEE	NIET CORRECT VOLGENS WISKUNDIGE CONTROLE	NVT

02 CONTROLE INFORMATIE

AANSLUITING


NETBEHEERDER	Fluvius	SPANNING	1N400V
METER / BORD VERBINDING	10mm ²	MAX BEVEILIGING (A)	32A
AANTAL BORDEN	2	AANTAL KRINGEN	21
AARDELEKTRODE	aardingspen verticaal in de grond		

METINGEN


RI ALGEMEEN (MΩ)	18.43	BEOORDELING RI	OK
RE (Ω)	17.64	BEOORDELING RE	OK
CONTINUÏTEIT	OK		

De nodige maatregelen zijn genomen zodat de ingangsbeveiligingsklemmen van het automatische differentieelstroomapparaat, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk worden gemaakt door afdichting

NEE

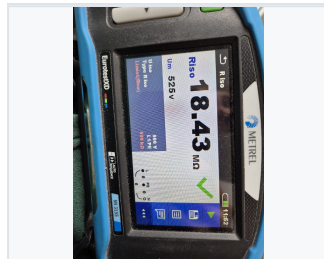

METING RI ALGEMEEN

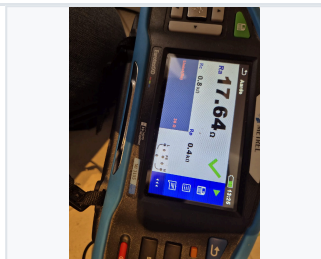

METING RE

03 TECHNISCHE INFORMATIE

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING


IA (MA)	IN (A)	I2T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	21	OK	OK

IA (MA)	IN (A)	I2T	TYPE	BEVEILIGDE KRINGEN	TEST	RCD
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	15	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

AANTAL KRINGEN	CURVE	BESCHERMING IN (A)	(ANDERE)	P	SECTIE (MM2)
1	C	16	-	2	2.5mm ²
1	C	16	-	2	2.5mm ²
16	C	20	-	2	2.5mm ²
1	C	32	-	2	6mm ²
2	C	25	-	2	4mm ²

SCHAKEL- EN VERDEELBORD

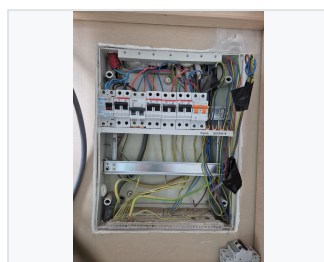

EENDRAADSCHEMA EN SITUATIETEKENING GOEDGEKEURD DOOR DE ERKENDE INSTANTIE

NEE

04 VASTSTELLINGEN EN OPMERKINGEN

BEOORDELING PER ONDERDEEL

Schema's	NIET OK	Testen	OK	Kabels / connecties	NIET OK
Verdeelbord	OK	Transformatoren	NVT	Differentieelstroominrichting	OK
Vermogensschakelaar(s)	OK	Aarding / equipotentiaal	OK	Toestellen, contactdozen	NIET OK

VASTGESTELDE INBREUKEN

Schema's

NIET OK

- 1.01 Ééndraadsschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- 1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

Kabels / connecties

NIET OK

- 18.14 Elektrische leidingen moeten zodanig worden gevoerd dat een continue bescherming verzekerd is. (Boek 1 Onderafdeling 5.6.11.)

Nota's bij de goedkeuring

NIET OK

- Nota 5: De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

1. de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
2. de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
3. de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de installatie en de delen ervan die op de datum van controle toegankelijk en zichtbaar waren. Bijlagen, indien aanwezig, volgen na dit verslag.
