ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 18/03/2022
Inspecteur: Koen Van De Veire
Mentor:
Installateur: -
ID-label:
Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 19481298

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Vromondstraat
Huisnummer	15
Busnummer	
Postcode	9270
Gemeente	Laarne
Land	België

Eigenaar

Naam	Joos Benoit
Straatnaam	Vromondstraat
Huisnummer	15
Busnummer	
Postcode	9270
Gemeente	Laarne
Land	België

Installateur

Naam	Joos Benoit
BTW nr.	-
Telefoonnummer	0497486843
E-mail	Benoitjoos9@hotmail.com

Type : woning

EAN : 54

☑ **Niet meegedeeld**

Teller Nr.: : -


Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Verzwaring van een huishoudelijke installatie van na 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS
Spanning: 3N400V
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 32 A
Aantal borden: 1
Aantal kringen: 22
Ri algemeen: 19,67 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 16,86 Ω OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	22	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	U	32		2	6
2	U	20		2	2,5
2	U	10		2	1,5
3	U	16		2	1,5
9	C	16		2	2,5
3	C	10		2	1,5
1	C	6		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O: Keuken en sanitaire toestellen maken geen deel uit van ons nazicht

O: Verlichtingstoestellen maken geen deel uit van ons nazicht

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 18/3/2047

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie

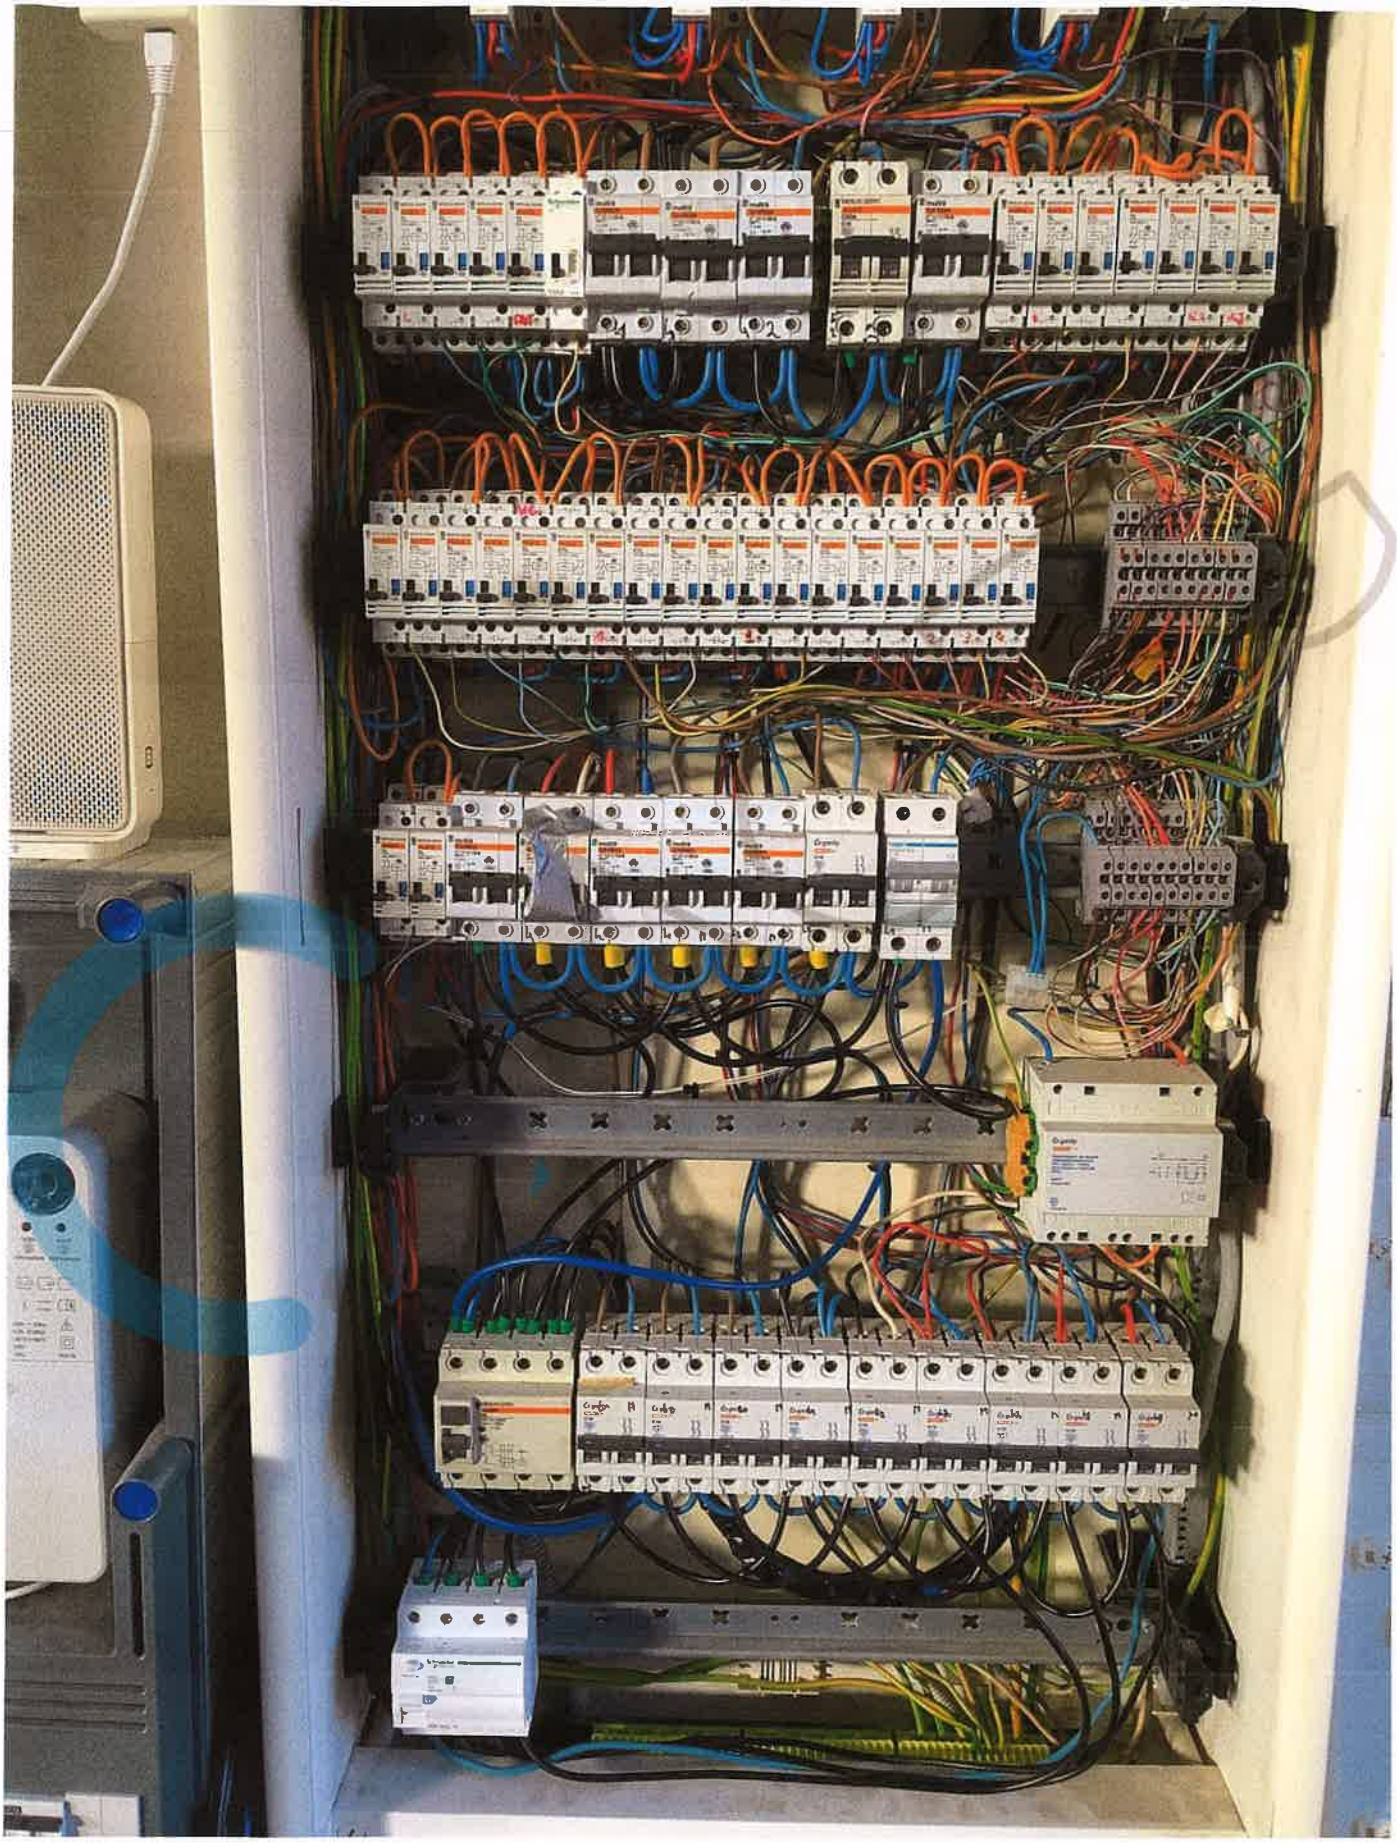
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

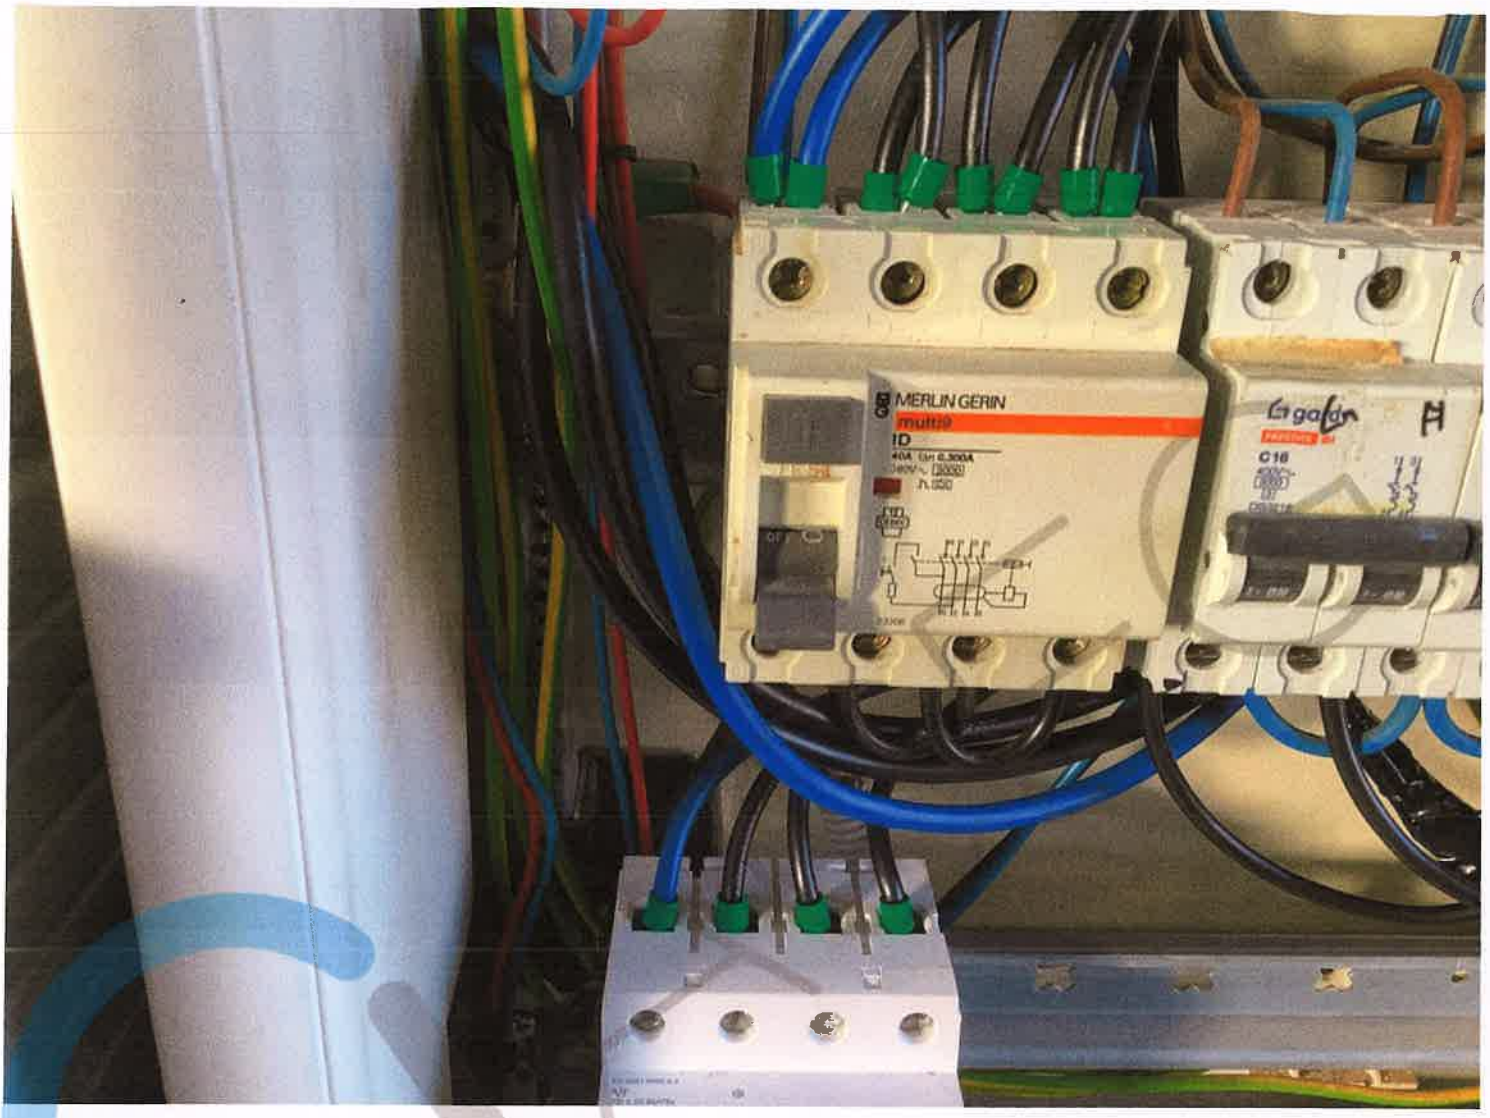
Kwaliteit

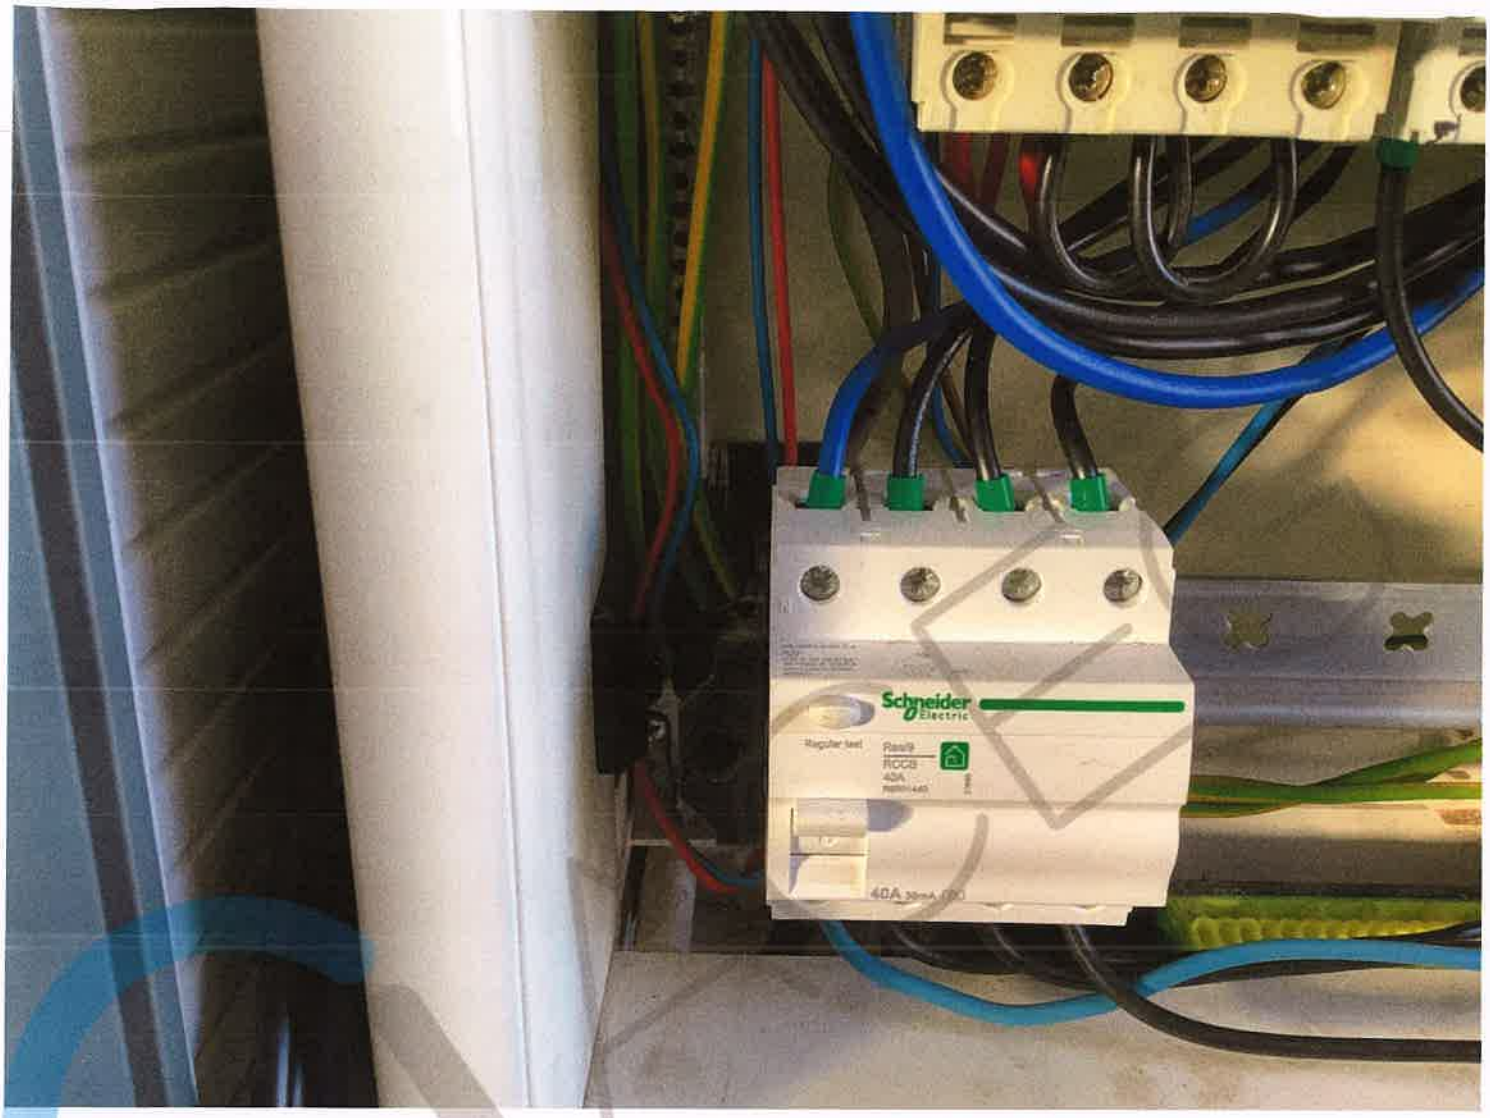
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

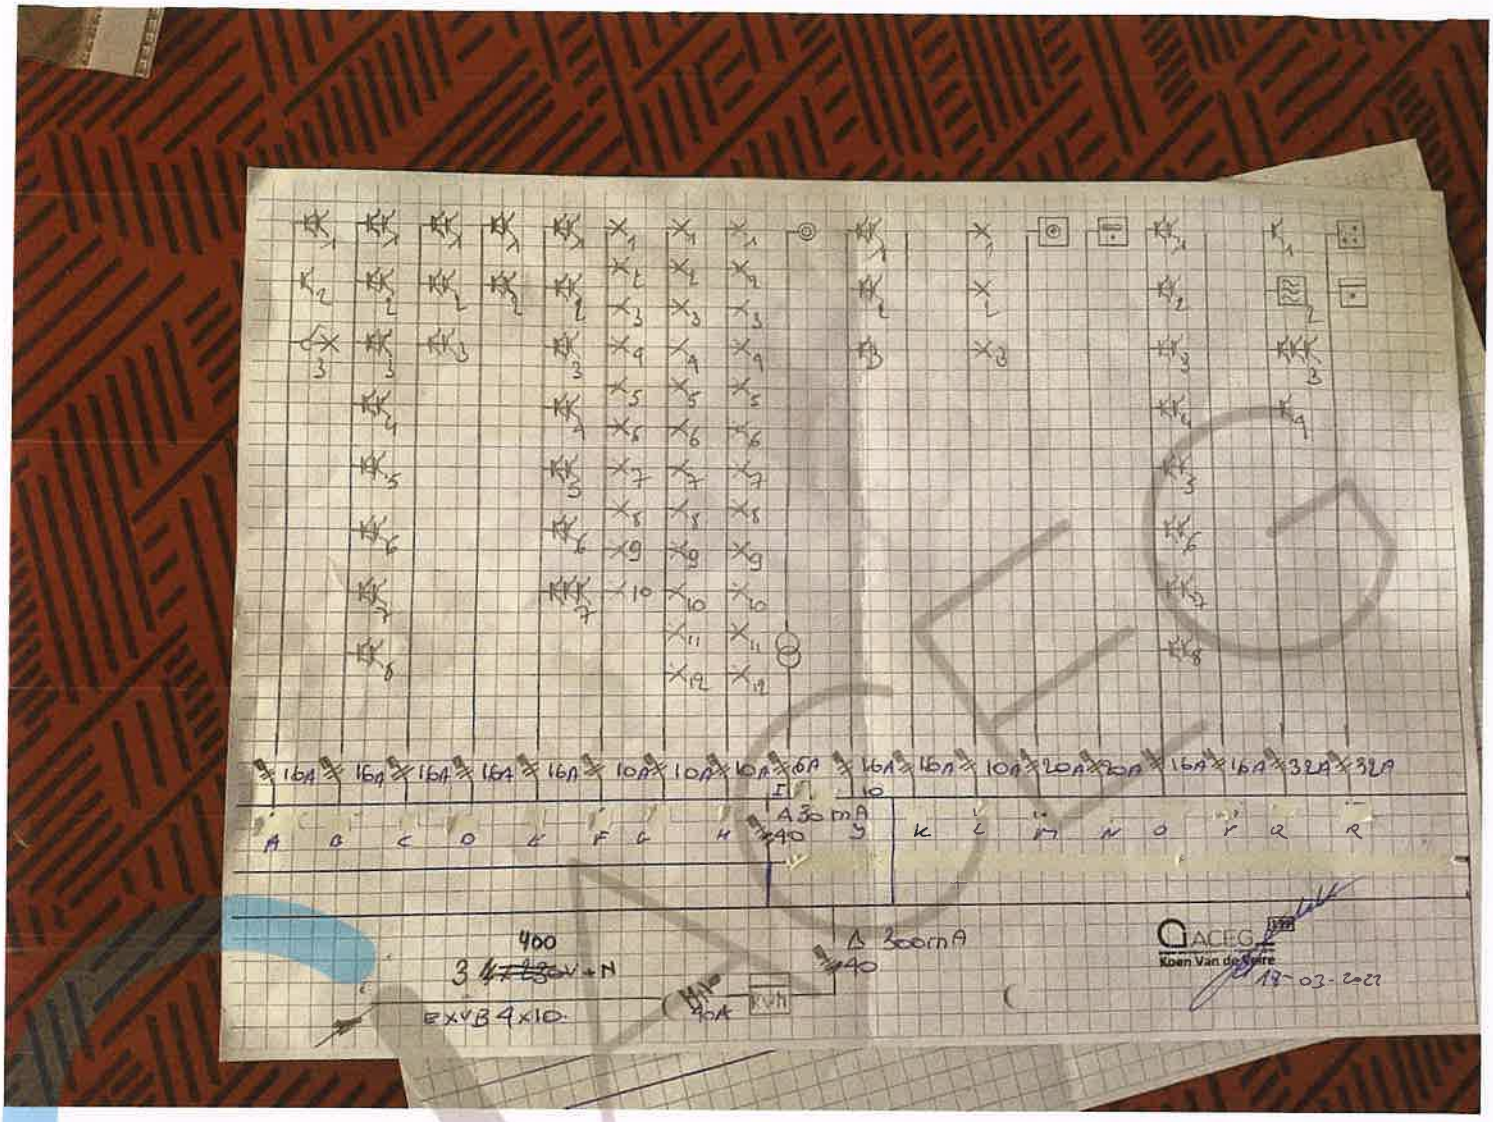
Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 18/3/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

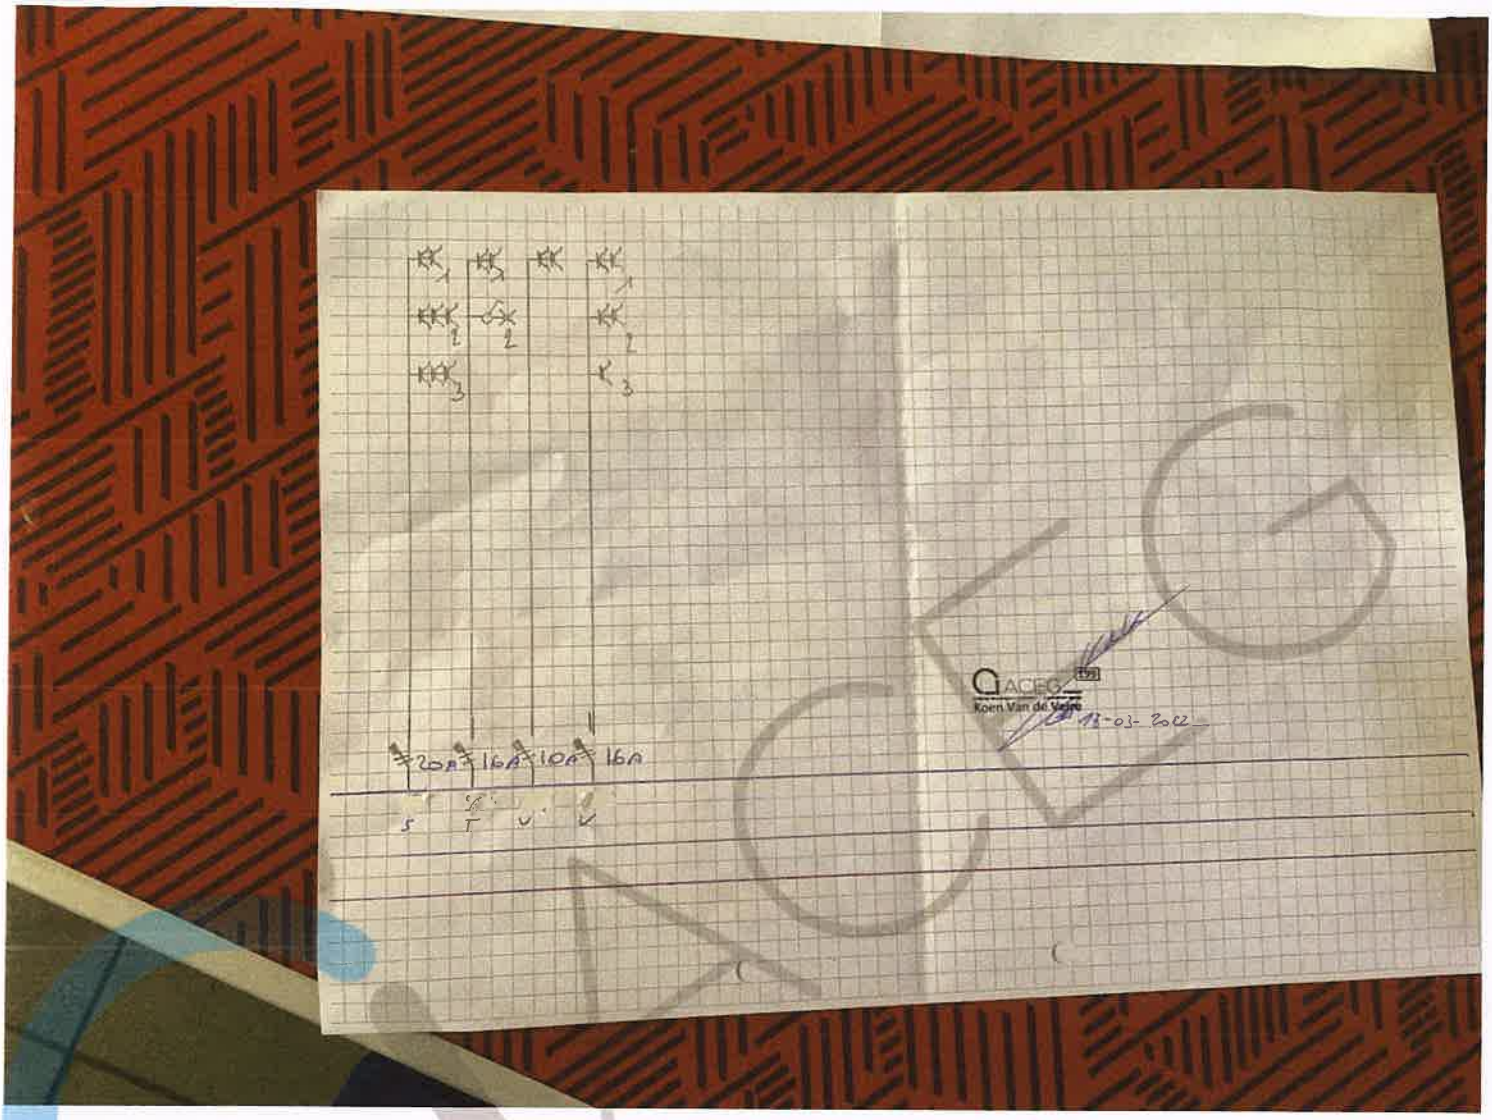
ACEG

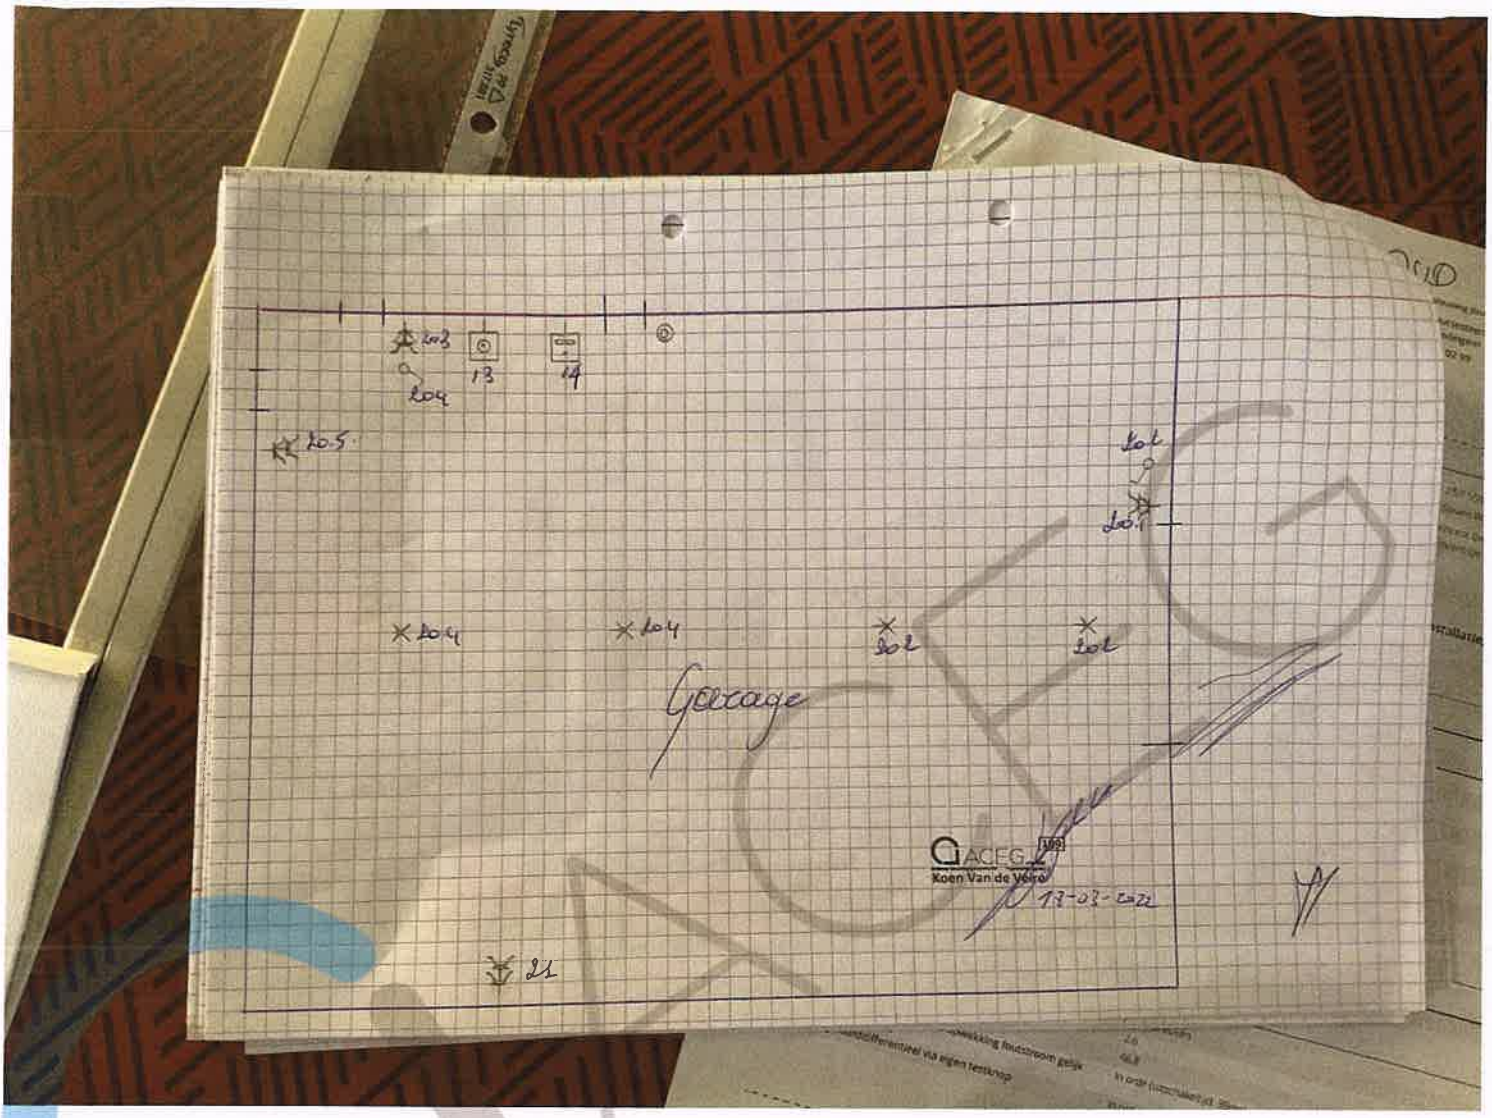


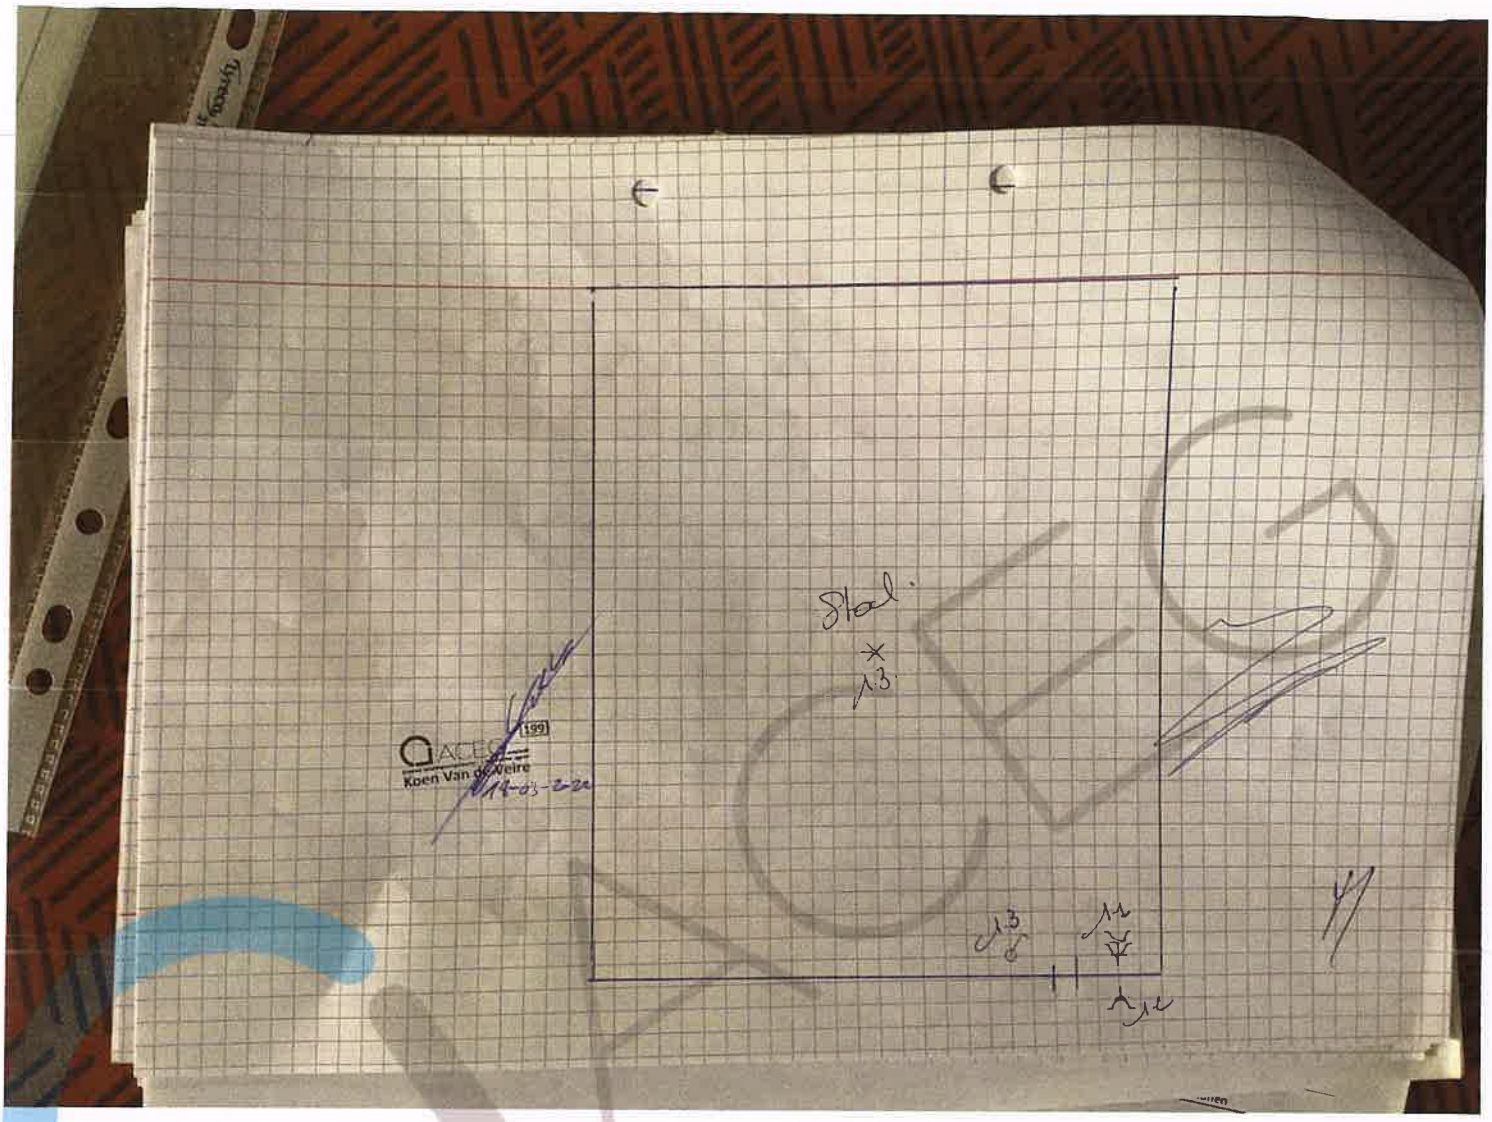

MERLIN GERIN
multi9
ID
C16

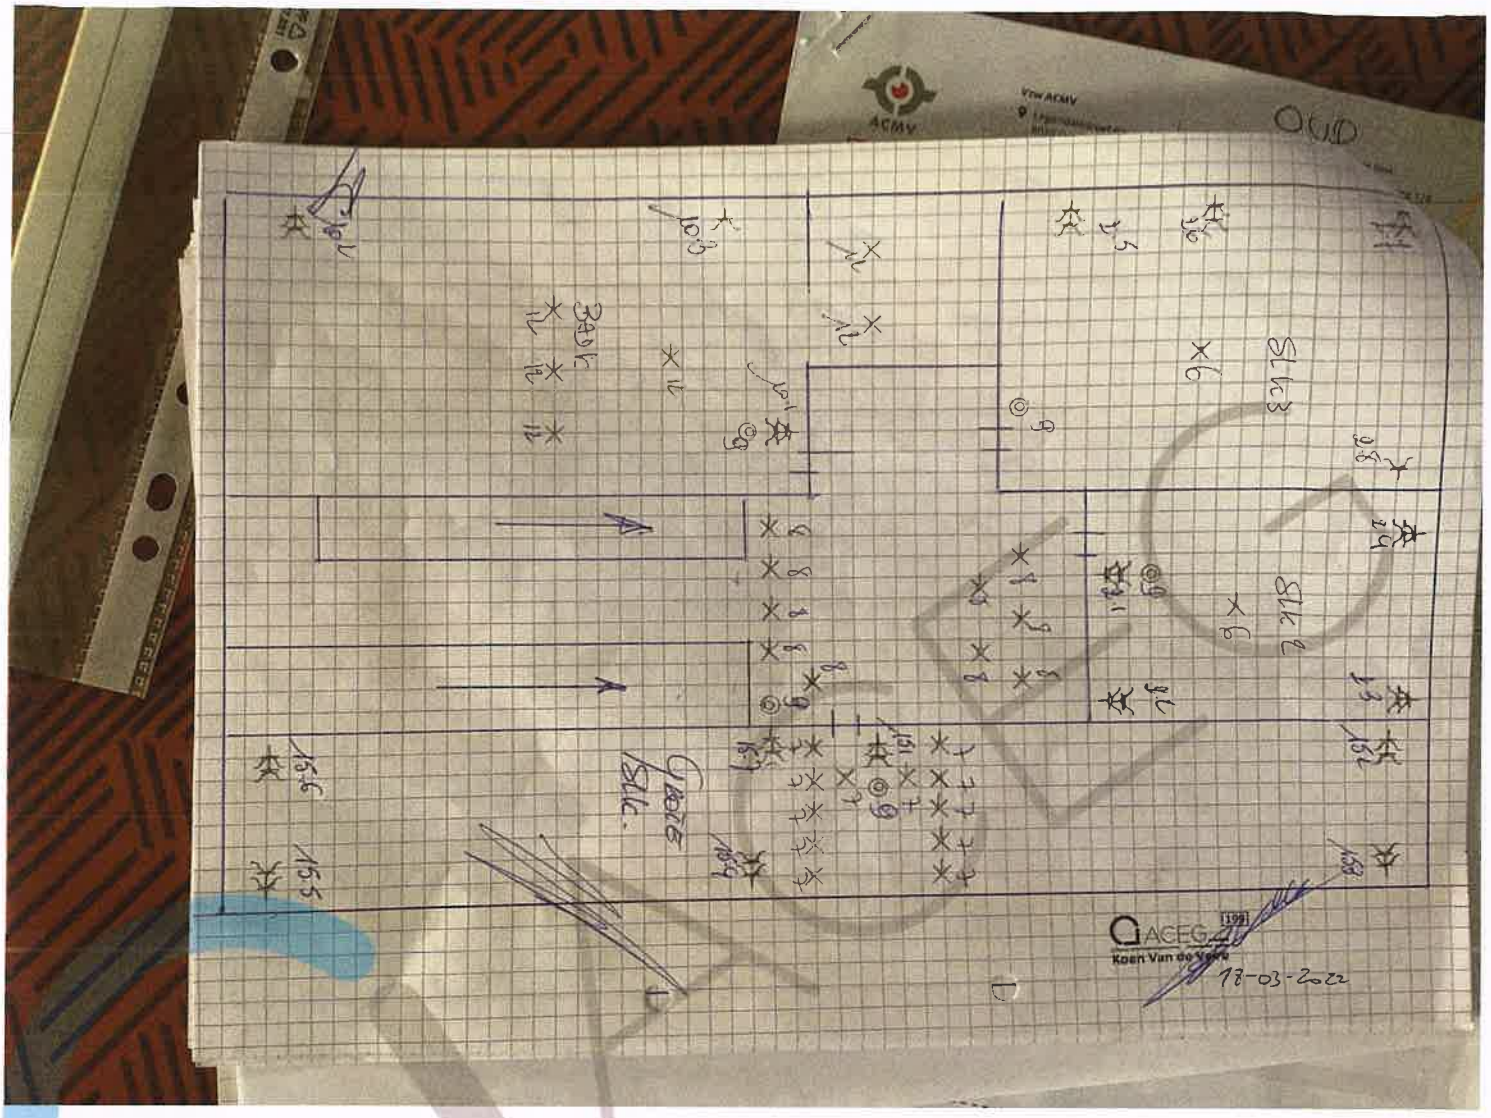

Schneider
Electric
Regular test
RCCB
40A

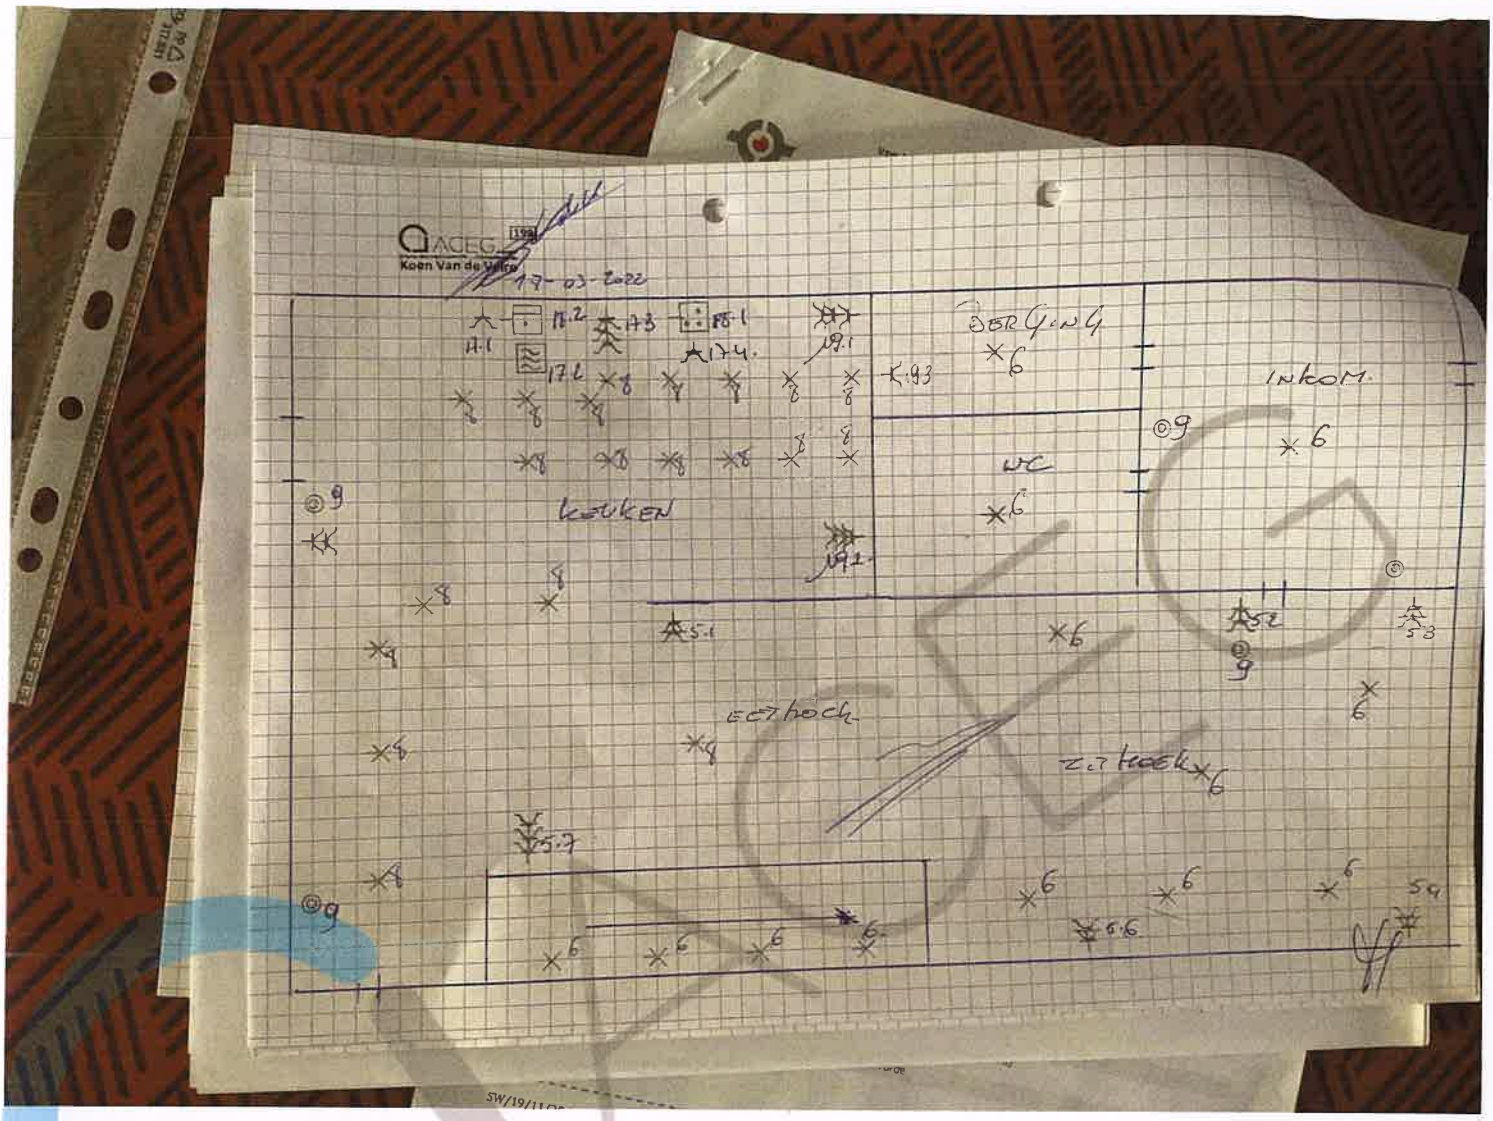

16A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 16A 6A 16A 16A 10A 20A 20A 16A 16A 32A 32A
A B C D E F G H J K L M N O P Q R
A 30 mA
40
10
400
3 ~ 50V + N
EXVB 4x10
A 300mA
40
40A
kWh
ACEG
Koen Van de Velde
18-03-2021

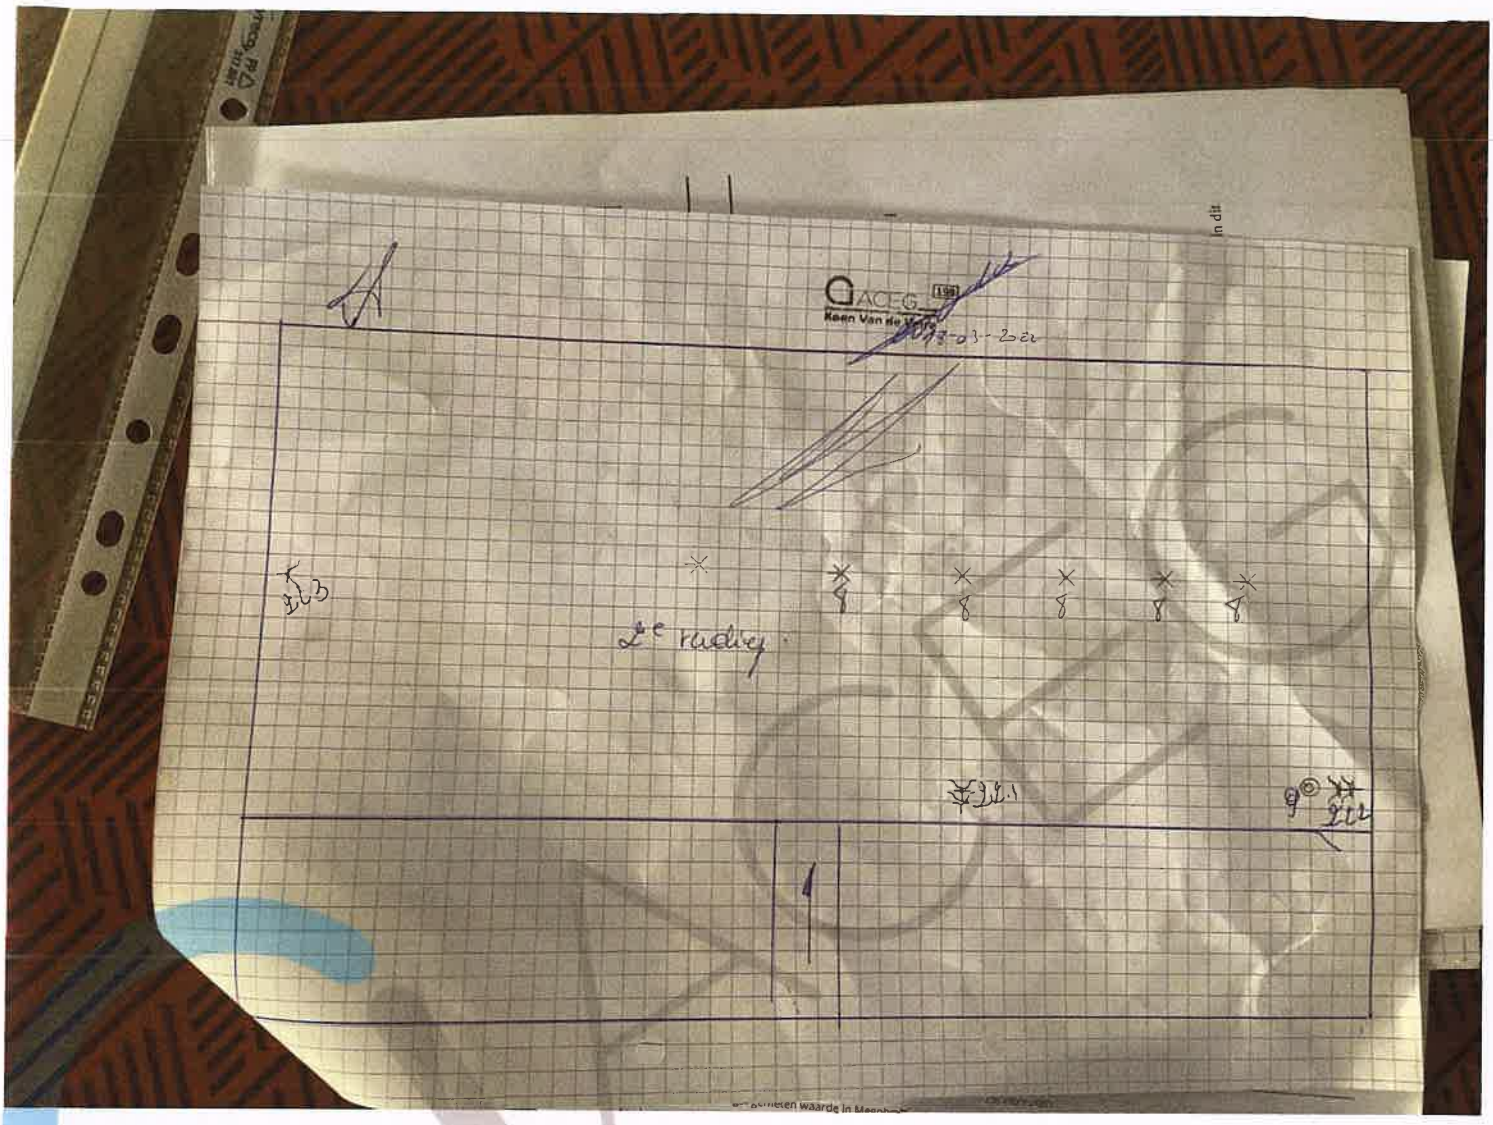

20A
16A
10A
16A
S
T
V
K
ACEG
Koen Van de Velde
18-03-2022


Garage
ACEG
Koen Van de Velde


Staal
1.3
Koen Van de Veire
14-03-22


ACEG
Koen Van de Velde
18-03-2022


Koen Van de Velde
17-03-2022
KEUKEN
WC
INKOM
DOORGANG
K:93
ECTHOEK
ZITHOEK


GACE-G
Keen Van de Velde
2e radius


Eurotest 61557
METREL
START
ESC
SAVE
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
CE
LOCATOR
POWER, ENERGY
HARMONICS


Eurotest 61557
METREL
START
ESC
SAVE
RCL
SETUP
HELP
F1
F2
F3
F4
500V
19.67
520V
RLOOP N-PE
ZLOOP
ZLINE
RCD
LOCATOR
POWER,
ENERGY
